

SOBRE A

ENRIQUE CESPEDES GUZMAN
CED: 071-0031339-9



Firma del Representante Legal

COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND
(AMPB)

PRESENTACIÓN: OFERTA TÉCNICA
REFERENCIA: AMPB-CCC-CP-2023-0002

ORIGINAL

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND
(AMPB)**

27 de julio de 2023

Página 1 de 2

PRESENTACIÓN DE OFERTA

Señores

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Pliegos de Condiciones para la Licitación de referencia, **AMPB-CCC-CP-2023-0002** incluyendo las siguientes enmiendas/ adendas realizadas a los mismos:

NO TENEMOS RESERVAS

- b) De conformidad con los Pliegos de Condiciones y según el plan de entrega especificado en el Programa de Suministros/ Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a suministrar los siguientes bienes y servicios conexos, o ejecutar los siguientes servicios u Obras:

Contratación De La Construcción de Obras del Presupuesto Administrativo 2023 Del Ayuntamiento Del Municipio De Pedro Brand,

- **ITEM 5. 2da Etapa de Suministró y Compactado de Tosca Duarte Vieja, Pedro Brand.**
- **ITEM 10. Instalación de Tuberías La Esperanza Eduardo Brito I y II, La Polonia.**
- **ITEM 11. Suministro y Compactación de Tosca Los Corozos, El Catalán y La Mina.**

REFERENCIA: AMPB-CCC-CP-2023-0002

- c) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación, por el importe del **CUATRO POR CIENTO (4%)** del monto total de la adjudicación, para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato.
- d) El mantenimiento de nuestra oferta es por 90 días
- e) Para esta licitación no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación.

- f) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Comprador para presentar ofertas.
- g) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.
- h) Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.

ING. ENRIQUE CESPEDES GUZMÁN en calidad de OFERENTE debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de (ING. ENRIQUE CESPEDES GUZMÁN.).

Firma _____

Sello

(Persona o personas autorizadas a firmar en nombre del Oferente)

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO
BRAND (AMPB)**

27 de julio de 2023

Página 1 de 1

FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

Departamento de Compras y Contrataciones

1. Nombre/ Razón Social del Oferente: ING. ENRIQUE CESPEDES GUZMÁN
2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: <i>[indicar el nombre jurídico de cada miembro del Consorcio]</i>
3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: 071-0031339-9
4. RPE del Oferente: 17041
5. Domicilio legal del Oferente: Calle Primera 1ra., La Yuca, 5, Los Girasoles I
6. Información del Representante autorizado del Oferente: Nombre: Ing. Enrique Cespedes Guzmán Dirección: c/ Real Del Este, manzana Q4, Ciudad Real I, Sto. Dgo. Números de teléfono y fax: 849-916-8799 Dirección de correo electrónico: construccionesiana@gmail.com

E.C.G.

ENRIQUE CESPEDES GUZMAN

C/1ra, No.5, La Yuca, Los Girasoles, Santo Domingo.
Telf. 849-916-8799, 809-714-9195, CED. 071-0031339-9

CARTA DE AUTORIZACION


27 de julio de 2023

Señores:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND (AMPB)

Por medio de la presente Yo, **Ing. Enrique Céspedes Guzmán**, Cedula de identidad y electoral **No. 071-0031339-9**, me dirijo a ustedes para autorizar al Ayuntamiento Municipal de Pedro Brand a divulgar y hacer de conocimiento público el contenido de mis ofertas y a verificar en cualquier institución las informaciones presentadas en el proceso de **"Contratación De La Construcción de Obras del Presupuesto Administrativo 2023 Del Ayuntamiento Del Municipio De Pedro Brand, Ítem. No. 5. 2da Etapa de suministro y Compactado de Tosca Duarte Vieja, Pedro Brand, Ítem 10. Instalación de Tuberías La Esperanza Eduardo Brito I y II, La Polonia y Ítem 11. Suministro y compactación de Tosca Los Corozos, El Catalán y La Mina. (Referencia: AMPB-CCC-CP-2023-0002).**

Sin otro particular se despide.



Ing. Enrique Céspedes Guzmán
Representante Técnico

Registro de Proveedores del Estado (RPE)

Constancia de inscripción

RPE: 17041

Fecha de registro: 5/10/2011

Razón social: ENRIQUE CESPEDES GUZMAN

Género: Masculino

Certificación MIPYME: No

Clasificación empresa:

Ocupación: INGENIERO CIVIL

Domicilio: C/ DIEGO ALVARADO NO. 49, LA YUCA, DISTRITO
NACIONAL,,

- REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de contacto: ENRIQUE CESPEDES GUZMAN

Fecha actualización: 5/9/2013

No. Documento: 07100313399 - Cédula

Provee: Obras

Registro de beneficiario: No

Estado: Activo

Motivo:

Observaciones:

E. L. G.

Actividad comercial

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
30120000	Carreteras y paisaje
30200000	Estructuras prefabricadas
30220000	Estructuras permanentes
52100000	Revestimientos de suelos
71100000	Servicios de minería
71110000	Servicios de perforación y prospección petrolífera y de gas
71120000	Servicios de construcción y perforación de pozos
72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
72130000	Construcción general de edificios
73120000	Industrias del metal y de minerales
81100000	Servicios profesionales de ingeniería

Portal Transaccional - 24/7/2023 12:31:33 p.m.

E.C.G



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4
CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: **C0223952884320**


La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **ENRIQUE CESPEDES GUZMAN**, RNC No. **07100313399**, con su domicilio y asiento fiscal en **SANTO DOMINGO DE GUZMAN**, Administración Local **ADM LOCAL HERRERA**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto	
• IMPUESTO PROP. INMOBILIARIA	• ANTICIPO RENTA 3 CUOTAS
• IMPUESTO A LA RENTA PER. FIS.	• ITBIS

Dada en la **OFICINA VIRTUAL**, a los **veinticuatro (24)** días del mes de julio del año dos mil veintitres (2023).


NOTAS:

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.



Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060 (desde el interior sin cargos).

E. C. G.



071-0031339-9



NAGUA

15 JULIO 1975

NACIONALIDAD REPUBLICA DOMINICANA

SEXO M SANGRE O+ ESTADO CIVIL SOLTERO

Ocupación: INGENIERO(A)

FECHA DE EXPIRACIÓN

15 JULIO 2024

ENRIQUE
CESPEDES GUZMAN

COROLLARY 1.

Abstract

STATISTICAL ANALYSIS

452

UNION-OWNED COLLEGE

ESCUOLA LABORAL (CLUB CULTURAL)

PUEBLO NUEVO

CALLE CENTRAL NO. 90 ESQUINA 1RA.

DIRECCION DE RESIDENCIA

7. BO, PUERTO RICO Casa 6

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

PUEBLO NUEVO

STANDARD

LOS ALCARRIZOS



071-0031339-9

REGISTRO DE NACIMIENTO

071-01-1975-0204-000-1068

CONGO POSTAL

10902

W11770120

ROMAN ANDRÉS JAQUEZ URANZO
PRESIDENTE JCE

IDDOM071003133<994<<<<<<<<<<<<
7507151M2407153DOM<<<<<<<<<<<<1
CESPEDES<GUZMAN<<ENRIQUE<<<<<<

DECLARACION JURADA



Quien suscribe el señor **ENRIQUE CESPEDES GUZMAN**, dominicano, Profesional Ingeniero Civil, Estado Civil Soltero, Mayor de edad, portador de la cedula de Identidad y Electoral No. **071-0031339-9**, domiciliado y residente en el esta ciudad de santo domingo, por Licitación Publica declaro, **BAJO LA MAS SOLEMNE FE DE JURAMENTO LOS SIGUIENETES.**

PRIMERO: Que no estoy en ninguna de las Situaciones de exclusión enumeradas en el Artículo 14 de la Ley 340-06, Sobre Compra y Constataciones de bienes servicios obras y concesiones.

SEGUNDO: Que estoy al día en el pago de mis Obligaciones de la seguridad social y tributaria, conforme a nuestra legislación vigente.

TERCERO: Que no tengo juicio pendiente con el Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno Central, de la Instituciones Descentralizadas y Autónomas No Financieras y de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social y que no estamos sometido a ningún proceso de quiebra o de liquidación.

CUARTO: Que nosotros ni el embargado no poseo juicio o relaciones pendientes durante los últimos cinco años motivo de contratos anteriores o en ejecución suscrita con la administración pública.

QUINTO: Que nosotros ni el personal no ha sido condenado por un delito relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca de su idoneidad para firmar un contrato Adjudicado.

La Presente declaración Jurada ha sido realizada en la Ciudad de Santo Domingo, a los Veintiséis (26) del mes de Julio del año Dos Mil Veintitrés (2023).

ENRIQUE CESPEDES GUZMAN

Declarante.

YO: Dr. **BARTOLO A. LALANE DE LA CRUZ**, Abogado - Notario público, de los del No. Del Municipio de los Alcarrizos, Colegiatura No. 3157, **CERTIFICO Y DOY FE**, que la firma que aparece en el presente acto fue puesta de manera libre y voluntaria por el señor **ENRIQUE CESPEDES GUZMAN**, quien me ha declarado bajo la fe del juramento que esa es la misma firma que ella Acostumbra a utilizar en todos los actos de su vida, tanto pública como privada. En el Municipio Los Alcarrizos, Provincia Santo Domingo a los Veintiséis (26) del mes de Julio del año Dos Mil Veintitrés (2023).

E.C.G.



Dr. BARTOLO A. LALANE DE LA CRUZ
NÓTARIO PÚBLICO.



PERMISOS DE MEDIO AMBIENTE DE LA MINA DE DONDE SE EXTRAERÁ EL MATERIAL DE RELLENO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
MEDIO AMBIENTE

08 MAY 2023

Santo Domingo de Guzmán, D.N.
27 de abril de 2023
Fecha de entrega en Ventanilla Única

VSA-04-2023-5387
DESPACHO

A : SARAH HERNÁNDEZ

Asunto : AUTORIZACIÓN PARA EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIALES.

Proyecto : INDUSTRIA DE AGREGADOS BASÁLTICA (CONCESIÓN MINERA BORINQUEN), (Código, 5249).
Municipio: Pedro Brand Provincia: Santo Domingo.

Anexo : Constancia de pago por volumen a extraer.

Mediante la presente se autoriza a la empresa **INDUSTRIA DE AGREGADOS BASÁLTICA (CONCESIÓN MINERA BORINQUEN)**, **SARAH HERNÁNDEZ**, (Código 5249), Coordenadas UTM 389289,45 E - 2052620,96 N, dentro de la parcela No. 16-A referida D.C. #5 La Guáyiga de la extracción y transporte de **cuarenta y cinco mil metros cúbicos (45,000 m³)** de materiales de la corteza terrestre (no metálicos).

La Dirección de Servicio de Ventanilla Única le notificará la autorización a la Dirección Provincial de Medio Ambiente y Recursos Naturales de **Santo Domingo** para permitir la fiscalización, control y seguimiento por parte de las autoridades competentes.

La emisión de la presente autorización está condicionada a lo siguiente:

1. Mantener como límites de la actividad el área requerida (polígono).
2. Para el transporte del material, utilizar lonas en buen estado con el objetivo de que estén bien cubiertos los camiones y así evitar derrames en las vías y daños a terceros;
3. Colocar un sistema de señalización vial y aplicar las medidas de control para el manejo adecuado del tránsito vehicular de la zona durante el desarrollo de la actividad;
4. Garantizar el cumplimiento de las normas ambientales vigentes que apliquen al caso de competencia;
5. Hacer la liquidación del material extraído en el Viceministerio de Suelos Y Aguas;
6. No afectar ningún curso de agua superficial con el proceso de extracción y mantener una franja de protección alrededor de cuerpos de agua de 150 metros, tal como lo establece la Resolución 0009-2021. Además de no afectar el nivel freático.
7. Disponer de un lugar propio distante a la zona de inundación (si aplica) para el acopio del material que resulte del proceso de extracción.
8. La liquidación presentada por su empresa y/o promotor será acogida de forma provisional, la cual estará sujeta a la verificación de una comisión técnica designada a tal efecto.

Esta autorización se concede a la parte interesada para la actividad anteriormente indicada y no podrá ser traspasada, vendida o comprada por otra persona física o jurídica.

Válido por noventa (90) días a partir de la fecha de entrega en Ventanilla Única.

Atención Ciudadana Ventanilla Única Dirección General de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Teléfono: 809 200 6400 Línea VSA: 809 200 6400 809 200 6400 AMB-DE-001-2023

MCH/RAMB/SP


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
MEDIO AMBIENTE

EL MINISTERIO se reserva el derecho otorgado por la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, No. 64-00 del 18 de Agosto de 2000; el Decreto No. 504-02 que establece la Norma Ambiental para la operaciones de la Minería No Metálica; en el procedimiento para Autorizar la Extracción de materiales de la Corteza Terrestre; el Decreto No. 145-03 que establece el sistema de control de los componentes de la Corteza terrestre y procedimiento para el cobro de la tarifa Ambiental; así como por cualquier ley, leyes complementarias, decretos, reglamentos y normas ambientales de dictar las medidas y/o sanciones pertinentes en caso de incumplimiento de este permiso, independientemente de la responsabilidad civil y penal que dichas acciones puedan acarrear.

Esta autorización o permiso quedará cancelada de pleno derecho sin ninguna consecuencia ni acción legal en contra de EL MINISTERIO, cuando:

- a) EL MINISTERIO estime que las actividades ejecutadas por EL PROMOTOR son contrarias al interés de protección del medio ambiente y los recursos naturales,
- b) EL PROMOTOR dé un uso a esta autorización, que sea distinto al que se consigna en este documento,
- c) Si EL PROMOTOR viole cualquier disposición del presente documento, así como cualquier disposición de la legislación ambiental vigente.

Dado en la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintisiete (27) días del mes de abril del año dos mil veintitrés (2023).


Miguel Ceara Hatton
Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

MCH/RAMS/JP

CC: Dirección Provincial Medio Ambiente.

Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA).

001946

PRUEBA DE GRANULOMETRIA DEL MATERIAL



República Dominicana

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Departamento Laboratorio De Suelos Y Pruebas De Materiales

ANÁLISIS Y CONTROL DE MATERIALES PARA CALLES Y CARRETERAS

PROYECTO: PARQUE INDUSTRIAL DUARTE

LOCALIZACIÓN: _____ FECHA: 02/09/2014.

MATERIAL: TOSCA TRITURADA GRIS

MINA PROCEDENCIA: _____ PROFUNDIDAD: _____

NOMBRE DE TAMIZ	ABERTURA DEL TAMIZ EN MM	PORCENTAJE QUE PASA
2"	63.30	-
1 1/2"	37.50	-
1"	25.40	94.82
3/4"	19.00	88.73
3/8"	9.25	57.68
Nº. 4	4.75	40.15
Nº. 10	2.00	26.43
Nº. 40	0.46	13.48
Nº. 200	0.075	9.06

LÍMITE LÍQUIDO NP %

POCENTAJE DE DESGASTE
(Máquina los ángeles) _____ %

LÍMITE PLÁSTICO NP %

ÍNDICE PLÁSTICO NP %

DENSIDAD SUELTA 1782 %

LÍMITE DE CONTRACCIÓN _____ %

CLASIFICACIÓN SEGÚN DESIGNACIÓN AASTHO 14-19.7

RELACIÓN DENSIDAD-HUMEDAD (PROCTOR)

DENSIDAD MÁXIMA 2279 KG/M³

MODIFICADO

HUMEDAD ÓPTIMA 7.25 %

Nº GOLPES POR CAPAS	C.B.R.	DENSIDAD (KG/M ³)	HINCHAMIENTO (%)
56-1	0.1 = 44.20 %	2236	0
	0.2 = 62.87 %		
56-2	0.1 = 49.90 %	2044	0
	0.2 = 62.80 %		

C.B.R. DS Max. (0.2")

Corregido A: 100% 62.80 %

Dr. Guadalupe Mateo
Enc. de Lab. De Suelos

Dr. López Ramos
Enc. Depcia. Compactación.

ECLG



3. Resultados de Ensayos.-

El material analizado corresponde a una tosca de color marrón que posee las siguientes propiedades:

<i>Muestra</i>	<i>Tosca</i>
<i>Material</i>	<i>Fragmentos de roca de hasta 3" con arena y algo de arcilla color marrón.</i>
<i>Graduación:</i>	
<i>Contenido de Fragmentos</i>	<i>82.2%</i>
<i>Contenido de Arena</i>	<i>13.6%</i>
<i>Contenido de Arcilla</i>	<i>4.2%</i>
<i>Plasticidad:</i>	
<i>Limite Liquido</i>	<i>43</i>
<i>Limite Plástico</i>	<i>23</i>
<i>Índice de Plasticidad</i>	<i>20</i>
<i>Clasificación:</i>	
<i>USCS</i>	<i>GW</i>
<i>AASHTO</i>	<i>A-2-7(0)</i>
<i>Densidad:</i>	
<i>Humedad Optima</i>	<i>10.1%</i>
<i>Máxima Densidad Seca</i>	<i>2219kg/m³</i>

E.C.V

LIQUID AND PLASTIC LIMITS TEST REPORT

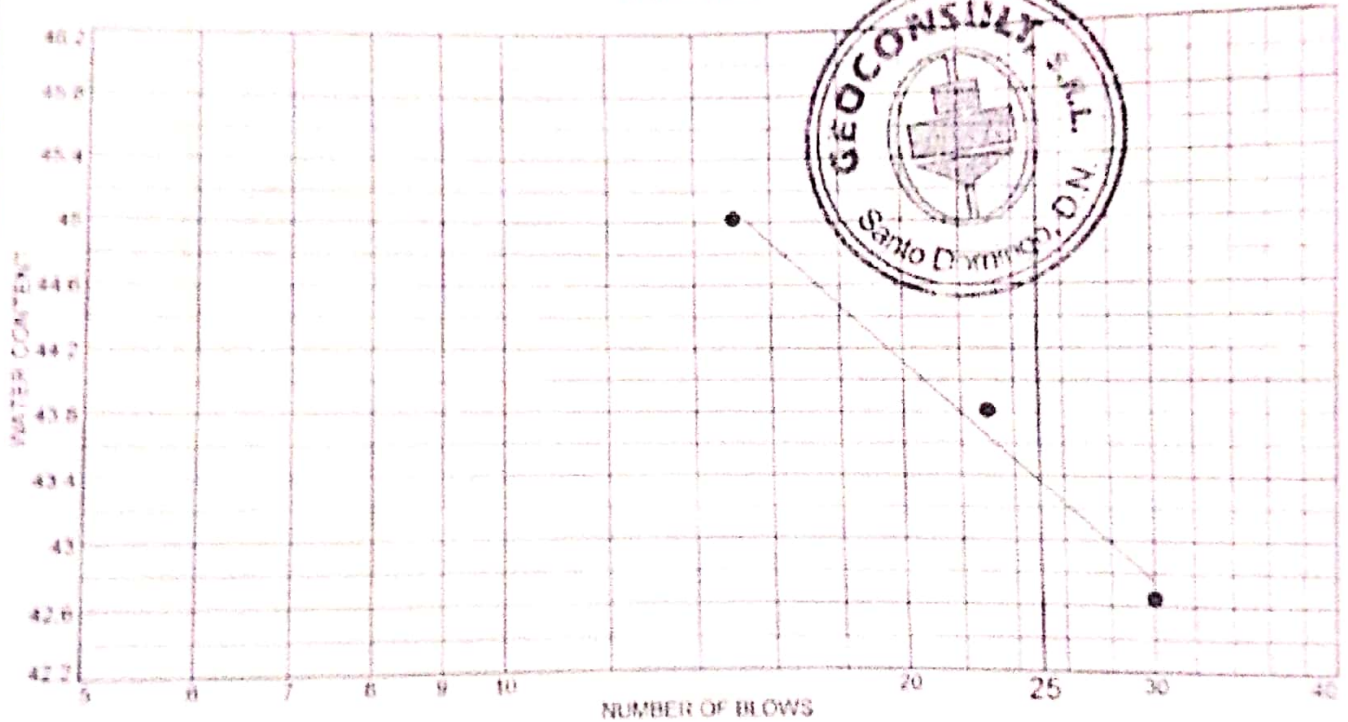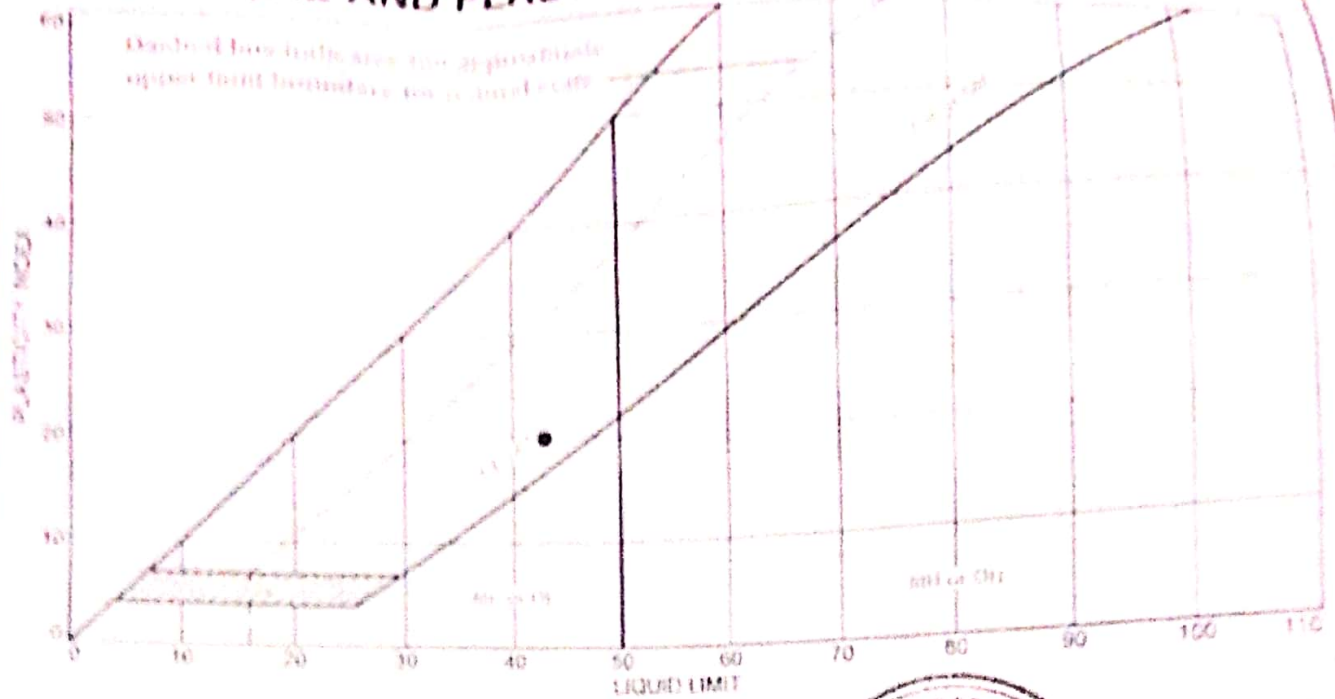

MATERIAL DESCRIPTION	LL	PL	PI	%<#40	%<#200	USCS
FRAGMENTOS DE ROCA DE HASTA 3" CON ARENA Y ALGO DE ARCILLA COLOR MARRON	43	23	20	57	42	GW

Project No. 1-930

Client: [REDACTED]

Project: HIMOENTRO

Source of Sample: PARQUE INDUSTRIAL DUARTE
Sample Number: LOSCA MARRON M-2


GEOCONSULT, S.A.

Santo Domingo, Dominican Republic

Remarks:

Figure


COMPACTION TEST REPORT

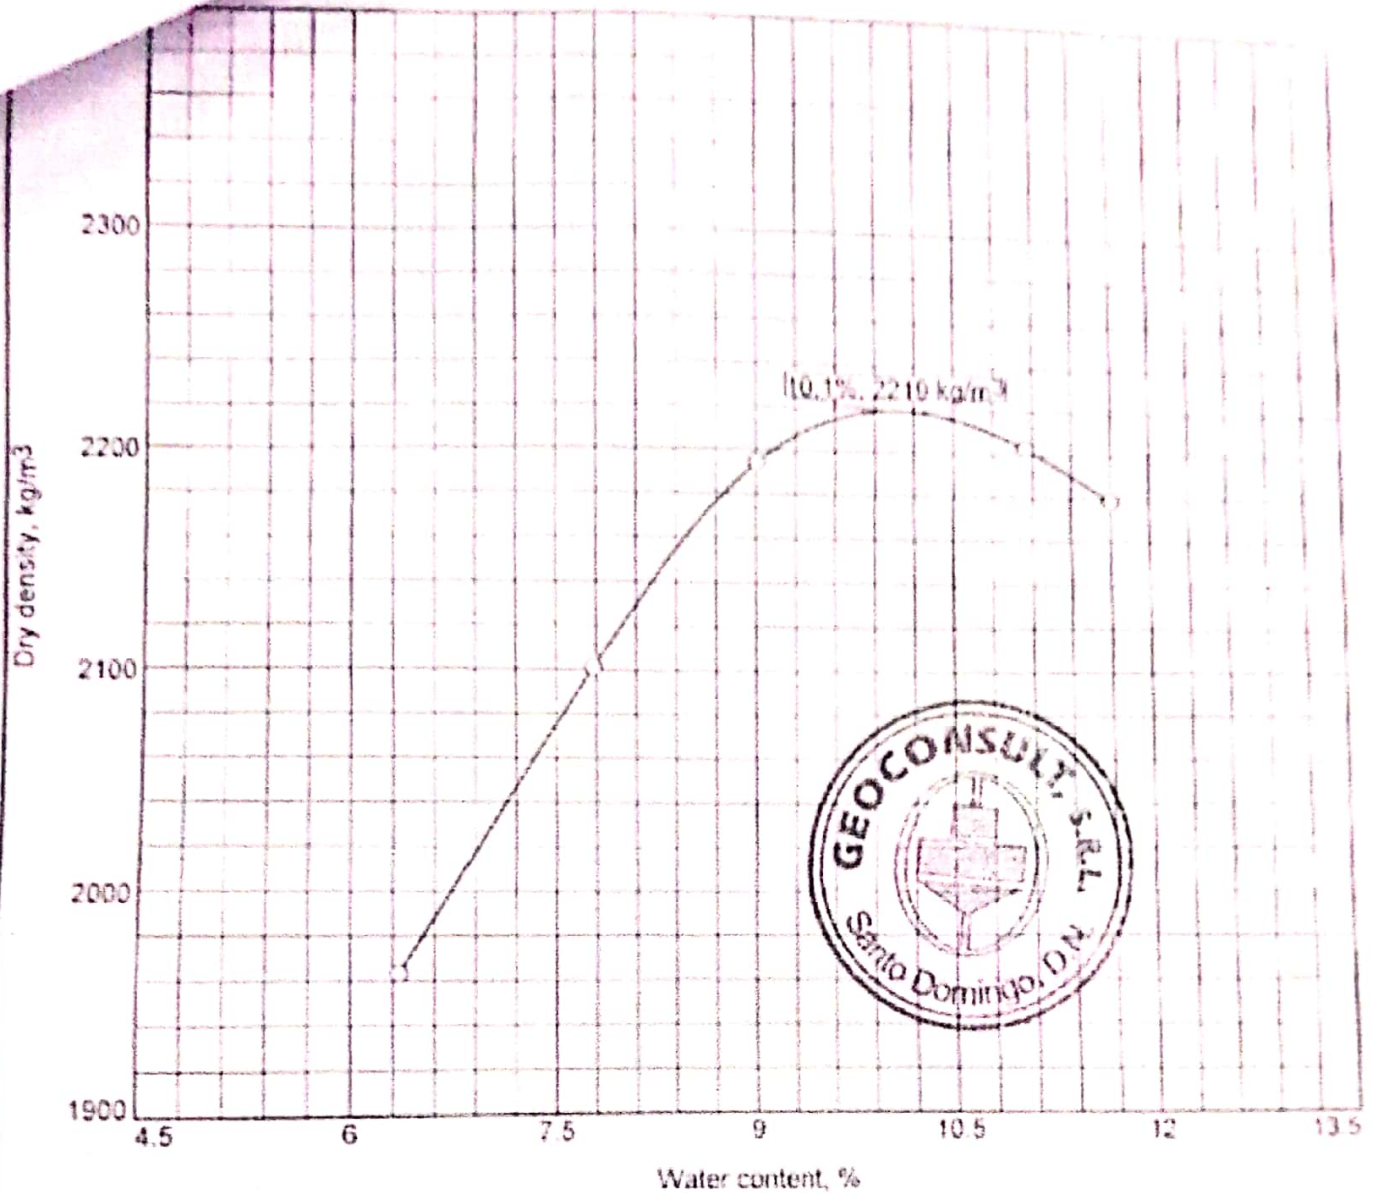

Test specification: ASTM D 1557-07 Method C Modified

Elev/ Depth	Classification		Nat. Moist.	Sp.G.	LL	PI	% > 3/4 in.	% < No. 200
	USCS	AASHTO						
	GW	A-2-7(0)			43	20	50.9	4.2
TEST RESULTS					MATERIAL DESCRIPTION			
Maximum dry density = 2219 kg/m ³					FRAGMENTOS DE ROCA DE HASTA 1" CON ARENA Y ALGO DE ARCILLA COLOR MARRON			
Optimum moisture = 10.1 %								
Project No. 1-950			Client: [REDACTED]		Remarks: 17/03/2016			
Project: HEMOCENTRO								
Source: PARQUE INDUSTRIAL DUARTE								
GEOCONSULT, S.A.								

Particle Size Distribution

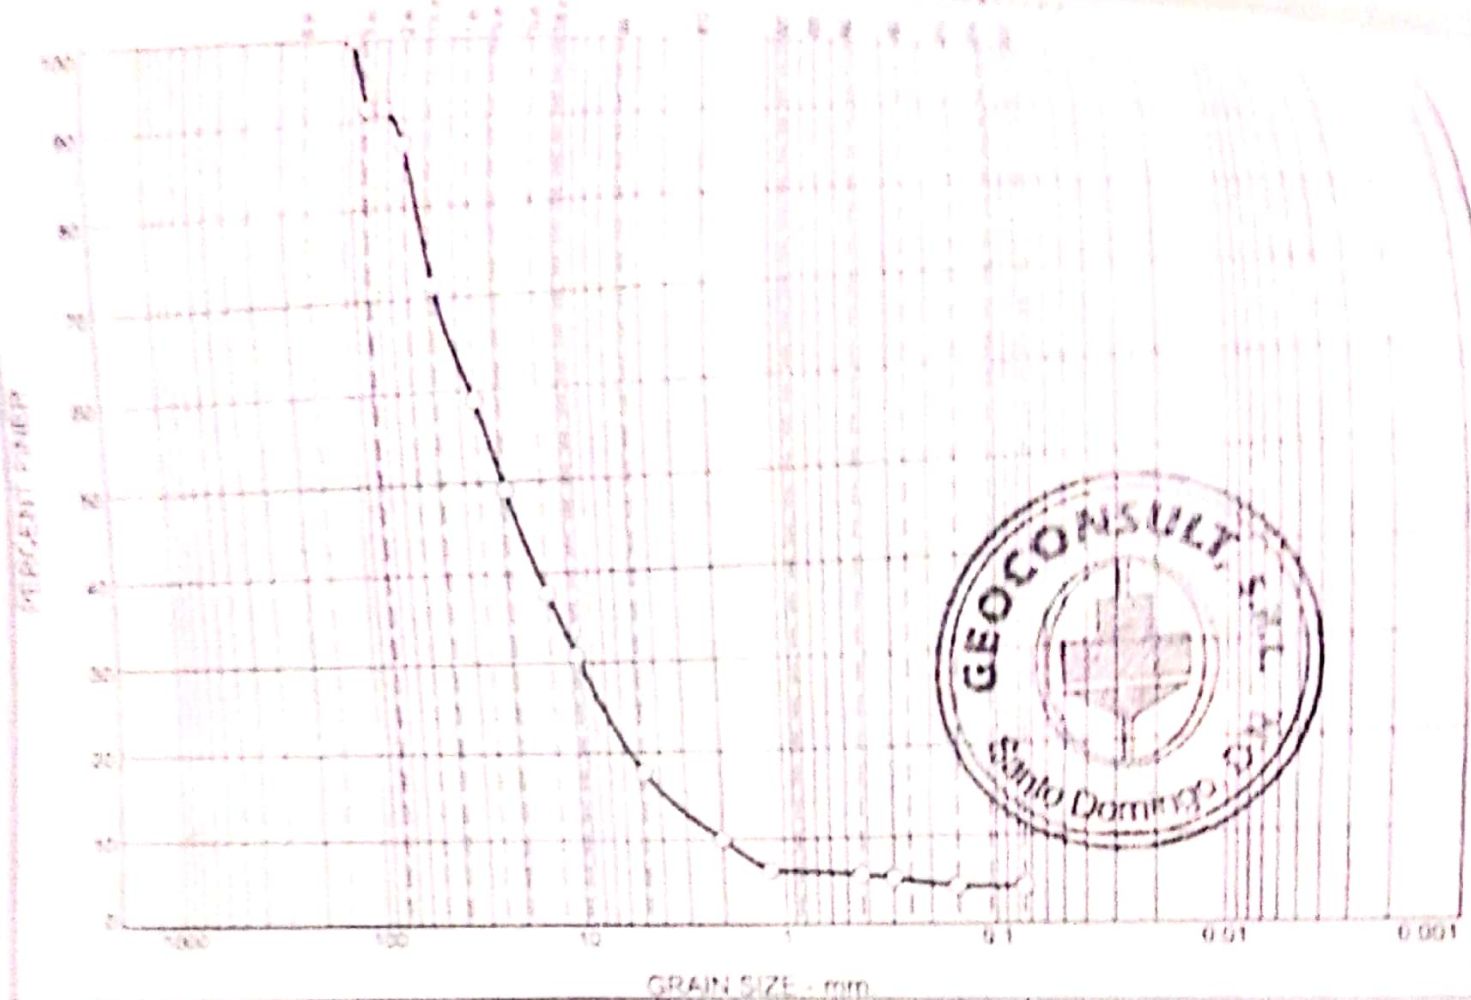

% -2"	% Gravel		% Sand			% Fines	
	Coarse	Fine	Coarse	Medium	Fine	Silt	Clay
6.5	42.4	31.3	7.8	4.3	1.5		4.2

SIEVE SIZE	PERCENT FINER	SPEC * PERCENT	PASS? (X=NO)
3/16"	100.0		
1/4"	91.5		
3/8"	91.5		
1/2"	87.2		
3/4"	71.3		
1"	50.0		
1 1/4"	49.1		
1 1/2"	37.8		
1 3/4"	30.8		
2"	17.8		
2 1/2"	10.0		
3"	6.3		
3 1/2"	5.7		
4"	5.3		
4 1/2"	4.4		
5"	4.2		

(no specification provided)

Soil Description

FRAGMENTOS DE ROCA DE HASTA 1" CON ARENA Y ALGO DE ARCILLA COLOR MARRON

Atterberg Limits

PL= 23

LL= 43

PI= 20

Coefficients

D₉₀= 56.1347

D₈₅= 48.4928

D₆₀= 26.3457

D₅₀= 19.5456

D₃₀= 9.1900

D₁₅= 3.7282

D₁₀= 1.9961

C_u= 13.20

C_c= 1.61

Classification

USCS= GW

AASHTO= A-2-7(0)

Remarks

Source of Sample: PARQUE INDUSTRIAL DUARTE
Sample Number: TOSCA MARRON M-2

Date: 19/03/2016

GEOCONSULT, S.A.

Client: [REDACTED]
Project: HEMOCENTRO

Figura

GEOCONSULT, S.R.L.
CONSULTORES EN GEOTECNIA

3.-Conclusiones.-

De acuerdo a los resultados obtenidos el material posee las características de granulometría, plasticidad y densidad adecuadas para ser utilizado en la construcción de los rellenos del proyecto [REDACTED]

Por:

GEOCONSULT, S.A.


Ing. Deivy B. Arias de Peña

9.1.9



GESAL INGENIEROS S.R.L.

Estudios Geotécnicos, Ensayos en Materiales, Diseño,
Construcción, Mantenimiento y Consultoría en
Ingeniería Civil, Geotécnica y Electromecánica
RNC 131960413

26/ Julio/2023
Santo Domingo, R.D.

Dirigido (a):
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AYUNTAMIENTO DE PEDRO BRAND
Municipio de Pedro Brand, Santo Domingo.


ASUNTO:
CARTA COMPROMISO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PROYECTO:
(PROCESO DE REF. AMPB-CCC-CP-2023-0002)

Estimados:


Luego de un cordial saludo, por medio de la presente, nuestra empresa **GESAL INGENIEROS SRL**, con RNC **1-31-96041-3**, muestra compromiso junto al **Ing. Enrique Céspedes**, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. **071-0031339-9**, participar en el proceso de Pruebas de Compactación Proctor sector Los Corozos, El Catalán, y La Mina, al igual que Pruebas de Compactación Proctor de la Calle Duarte Vieja, el Municipio Pedro Brand, Provincia de Santo Domingo (**REFERENTE AL PROCESO DE REFERENCIA AMPB-CCC-CP-2023-0002**)

Nuestra empresa consta de la certificación del Ministerio de Obras Públicas para la realización de los servicios antes mencionados.

Sin otro particular,
Atentamente.


Ing. María Elaine Galván A., MSc.
Gerente
GESAL INGENIEROS S.R.L
Ingeniera Geotécnica
CODIA 26812





Calle José Martí, 5, Urb. Máximo Gómez, Santo Domingo Norte
Tel. 809-735-4768; Cel. 829-562-0424, email: gessalingenieros@gmail.com

Pág. 1 de 1

DOCUMENTACION TECNICA

ITEM 5. 2DA ETAPA DE SUMINITRO Y COMPACTADO DE TOSCA DUARTE VIEJA, PEDRO BRAND.

ENRIQUE CESPEDES GUZMAN

C/1ra, No.5, La Yuca, Los Girasoles, Santo Domingo.
Telf. 849-916-8799, 809-714-9195, CED. 071-0031339-9

OFERTA TECNICA

Señores:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND (AMPB)

Por medio de la presente me dirijo para dar informe de las características de los materiales, condiciones de mano de obra y técnicas aplicadas para la **"Suministro y Compactado de Tosca en Calle Duarte Vieja, Pedro Brand": ITEM 5.**

Se aplicarán los precios, salarios y condiciones de mano de obra establecidos en las resoluciones **CNS-03-2022 & CNS-05- 2022**, emitidas por el Ministerio de Trabajo y el Gobierno de la República Dominicana.

Se realizará un corte del material inservible con un espesor de 20 cm.

Se hará una limpieza del área de trabajo, y se realizará el bote de todo el material cortado.

El material de relleno será extraído de minas aprobadas por el ministerio de medio ambiente.

El material a utilizar como relleno cumplirá con las especificaciones técnicas establecidas en los reglamentos R.014 Y R-033.

El relleno se hará en finas capas que garanticen una mayor compactación.

Para garantizar la compactación del material, estaremos haciendo la prueba de compactación Proctor. Para su realización estaremos contratando un laboratorio de mecánica de suelos certificado por el ministerio de obras públicas.

Mano de Obra.: Para la realización de los trabajos contamos con un personal técnico altamente calificado con más de 20 años de experiencia en la realización de este tipo de obras.

Para la supervisión de los trabajos tendremos un ingeniero residente, el cual cuenta con vasta experiencia en la realización de este tipo de actividades.

Sin otro particular se despide.



Ing. Enrique Céspedes Guzmán
Representante Técnico

ENRIQUE CESPEDES GUZMAN

C/1ra, No.5, La Yuca, Los Girasoles, Santo Domingo.
Telf. 849-916-8799, 809-714-9195, CED. 071-0031339-9

PLAN DE TRABAJO

Señores:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND (AMPB)

El siguiente es el plan de trabajo para llevar a cabo las actividades en la 2da Etapa "Suministro y Compactado de Tosca en Calle Duarte Vieja, Pedro Brand": ITEM 5.

1. Evaluación y Planificación:

- Se realizará una reunión con el equipo de trabajo y supervisores para revisar los detalles del proyecto y establecer los objetivos y plazos.
- Se llevará a cabo una inspección del área para evaluar las condiciones del terreno y las posibles restricciones.

2. Preparación del Sitio:

- Se procederá con la limpieza y despeje del área donde se realizarán las actividades.
- Se marcarán las áreas destinadas al corte de material y para el almacenamiento del material cortado.

3. Corte de Material Inservible en Calles:

- Se movilizará la maquinaria y equipos necesarios para el corte, como excavadoras y camiones volquete.
- Se llevará a cabo la ejecución del corte de material hasta alcanzar la profundidad de 0.20 m según las especificaciones, generando un volumen total de 224.40 m³.
- El material cortado se almacenará en el "Bote Material Cortado de 0 a 5 km", con un volumen de 30% expuesto, correspondiente a 290.40 m³.

4. Suministro y Compactado de Tosca:

- Se realizará la adquisición de la cantidad necesaria de tosca para realizar el relleno compactado, que corresponde a un volumen de 354.00 m³.
- Se movilizará la maquinaria adecuada para el suministro y la compactación de la tosca en las calles.

5. Relleno Compactado con Material Granular:

- Se llevará a cabo el relleno compactado utilizando la tosca suministrada, llevando el relleno a una profundidad de 0.30 m, como se especifica en el proyecto.

E. C. G.

ENRIQUE CESPEDES GUZMAN

C/1ra, No.5, La Yuca, Los Girasoles, Santo Domingo.
Telf. 849-916-8799, 809-714-9195, CED. 071-0031339-9

6. Control de Calidad y Supervisión:

- Se realizarán inspecciones regulares para garantizar que todas las actividades se realicen de acuerdo con las normas y especificaciones del proyecto.
- Se llevarán a cabo pruebas de calidad para verificar el nivel de compactación del relleno y asegurar que cumpla con los requisitos establecidos.

7. Gestión de Residuos:

- Se implementará un manejo adecuado de los residuos generados durante el corte y la compactación, garantizando su disposición adecuada y cumpliendo con las regulaciones ambientales.

8. Seguridad en el Sitio:

- Se tomarán medidas de seguridad para proteger al personal y a los transeúntes durante la ejecución de las actividades.
- Se asegurará el uso de equipo de protección personal y señalización adecuada para advertir sobre las áreas de trabajo.

9. Cronograma y Seguimiento:

- Se elaborará un cronograma detallado con fechas clave para cada actividad.
- Se realizará un seguimiento periódico del progreso del proyecto para asegurar que se cumplan los plazos establecidos.

10. Finalización y Entrega:

- Se realizará una revisión final del trabajo completado para verificar que se cumplan todos los requisitos del proyecto.
- Se entregará el proyecto terminado a los responsables y autoridades pertinentes.

Los trabajos serán realizados de forma secuencial de acuerdo al cronograma anexo y/o a los requerimientos del ayuntamiento municipal de Pedro Brand.

Sin otro particular se despide.



Ing. Enrique Céspedes Guzmán
Representante Técnico

ENRIQUE CESPEDES GUZMAN

C/1ra, No.5, La Yuca, Los Girasoles, Santo Domingo.
Telf. 849-916-8799, 809-714-9195, CED. 071-0031339-9

METODOLOGIA

Señores:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND (AMPB)

Mediante la presente les presentamos la Metodología Técnica para la ejecución de "Suministro y Compactado de Tosca en Calle Duarte Vieja, Pedro Brand" - ITEM 5: Corte de Material Inerbible, Bote Material Cortado de 0 a 5 km 30% exp., Relleno Compactado con Material Granular E = 0.30m en calles.

Evaluación y Planificación:

- 1.1. Se llevará a cabo un estudio topográfico detallado del área por parte del equipo de ingeniería para identificar las características del terreno y suelos existentes, determinando la ubicación precisa del corte y el relleno.
- 1.2. Los planos y especificaciones técnicas proporcionadas en el proyecto serán analizados por el equipo de ingeniería para comprender los criterios de corte y relleno, profundidades, volúmenes y ubicaciones específicas.

Diseño de Corte y Relleno:

- 2.1. Con base en la información obtenida en la evaluación, se diseñará un plan de corte que defina las áreas donde se removerá el material inerbible hasta la profundidad de 0.20m, respetando las restricciones y evitando afectar las estructuras subyacentes.
- 2.2. El área de almacenamiento de material cortado ("Bote Material Cortado de 0 a 5 km 30% exp.") será diseñada para mantener el volumen requerido y asegurar la estabilidad del material almacenado.
- 2.3. El diseño del relleno con tosca en las calles será definido, determinando la profundidad de 0.30m y estableciendo los puntos de control para asegurar una compactación uniforme.

Preparación del Sitio:

- 3.1. Se realizará la limpieza y despeje del área de trabajo, eliminando vegetación, escombros y cualquier obstáculo que pudiera interferir con las actividades de corte y relleno.
- 3.2. Las áreas designadas para el corte, almacenamiento de material cortado y el relleno serán marcadas claramente utilizando estacas o pintura en el terreno.

Corte de Material Inerbible:

- 4.1. Se movilizará maquinaria especializada, como excavadoras, para realizar el corte del material inerbible en las calles. La profundidad del corte se ajustará según las especificaciones del proyecto, que es de 0.20 metros.

E.C.G.

ENRIQUE CESPEDES GUZMAN

C/1ra, No.5, La Yuca, Los Girasoles, Santo Domingo.
Telf. 849-916-8799, 809-714-9195, CED. 071-0031339-9

4.2. El proceso de corte será controlado mediante estaciones de control topográfico para asegurar que se alcance la profundidad requerida y se mantengan los niveles adecuados.

Almacenamiento en el "Bote Material Cortado de 0 a 5 km 30% exp.":

- 5.1. El material cortado será cargado en camiones volquete y transportado cuidadosamente hasta el "Bote Material Cortado" ubicado a una distancia no mayor de 5 km del punto de corte.
- 5.2. Se distribuirá el material en el bote de manera uniforme y compacta, asegurando que se alcance el volumen necesario para cumplir con el 30% expuesto.

Suministro de Tosca para Relleno:

- 6.1. Se procederá al pedido de tosca de alta calidad, que cumpla con los criterios de granulometría y características técnicas requeridas para el relleno.
- 6.2. La tosca será transportada a la zona de trabajo y almacenada en áreas previamente preparadas, evitando la contaminación o alteración de la calidad del material.

Relleno Compactado con Material Granular:

- 7.1. Se utilizará maquinaria de compactación adecuada, como compactadoras de rodillo liso o neumático, para realizar el relleno de las áreas excavadas con la tosca suministrada.
- 7.2. Se establecerán puntos de control para la medición de densidad y compactación, asegurando que el relleno alcance la densidad mínima especificada en el proyecto.

Control de Calidad y Supervisión:

- 8.1. Se llevarán a cabo inspecciones continuas durante todo el proceso de corte y relleno para garantizar el cumplimiento de los criterios técnicos y especificaciones del proyecto.
- 8.2. Se realizarán pruebas de densidad in-situ utilizando el método del núcleo y se verificará que el relleno compactado cumpla con los requisitos establecidos.

Gestión de Residuos y Limpieza Final:

- 9.1. Se gestionarán adecuadamente los residuos generados durante el corte y la compactación, siguiendo las regulaciones ambientales y de manejo de desechos.
- 9.2. Al finalizar los trabajos, se llevará a cabo una limpieza exhaustiva, retirando cualquier material excedente y dejando el área en condiciones óptimas.

Seguridad en el Sitio:

- 10.1. Se implementarán estrictas medidas de seguridad en el sitio de trabajo, incluyendo el uso de equipos de protección personal, señalización y medidas de prevención de accidentes.

Informes y Entrega:

- 11.1. Se elaborarán informes periódicos sobre el progreso del trabajo y los resultados de las pruebas de control de calidad.
- 11.2. Se entregará al cliente un informe final que incluya documentación técnica, resultados de pruebas y certificados de calidad que validen el cumplimiento exitoso de las actividades.

E.C.G.

ENRIQUE CESPEDES GUZMAN

C/1ra, No.5, La Yuca, Los Girasoles, Santo Domingo.
Telf. 849-916-8799, 809-714-9195, CED. 071-0031339-9

Esta metodología garantizará una ejecución eficiente y técnica de los trabajos de "Suministro y Compactado de Tosca en Calle Duarte Vieja, Pedro Brand" - ITEM 5, asegurando la calidad y la conformidad con los estándares de ingeniería establecidos. El equipo de ingenieros altamente capacitado y especializado en trabajos de construcción se compromete a llevar a cabo estas actividades cumpliendo con los más altos estándares profesionales. En caso de tener alguna consulta adicional o requerir más información técnica, se encuentra a disposición para proporcionarla.

Sin otro particular se despide.



Ing. Enrique Céspedes Guzmán
Representante Técnico

DOCUMENTACION TECNICA

ITEM 10. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS LA ESPERANZA EDUARDO BRITO I Y II, LA POLONIA.

ENRIQUE CESPEDES GUZMAN

C/1ra, No.5, La Yuca, Los Girasoles, Santo Domingo.
Telf. 849-916-8799, 809-714-9195, CED. 071-0031339-9

OFERTA TECNICA

Señores:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND (AMPB)

Por medio de la presente me dirijo para dar informe de las característica de los materiales, condiciones de mano de obra y técnicas aplicar para la " **Instalación de Tubería de 4" en PVC en los SECTORES EDUARDO BRITO I & II Y LA POLONIA. ITEM 10.**

En la realización de esta obra estaremos colocando 52 ml de tuberías de PVC DE Presión. SCH-40.

Se aplicarán los precios, salarios y condiciones de mano de obra establecidos en las resoluciones **CNS-03-2022 & CNS-05- 2022**, emitidas por el Ministerio de Trabajo y el Gobierno de la Republica Dominicana.

Se utilizaran tuberías de 4"de PVC presión sch-40 Y que cumplan con la norma ASTM D2241.

Se realizara un colchón de arena itabo de al menos 20 cm de espesor antes de colocar la tubería.

Para la unión de la tubería se estar utilizando pegamento pvc de alta calidad de las marcas reconocidas en el mercado.

Mano de Obra.: Para la realización de los trabajos contamos con un personal técnico altamente calificado con más de 20 años de experiencia en la realización de este tipo de obras.

Para la supervisión de los trabajos tendremos un ingeniero residente, el cual cuenta con vasta experiencia en la realización de este tipo de actividades.

Sin otro particular se despide.



Ing. Enrique Céspedes Guzmán
Representante Técnico

ENRIQUE CESPEDES GUZMAN

C/1ra, No.5, La Yuca, Los Girasoles, Santo Domingo.
Telf. 849-916-8799, 809-714-9195, CED. 071-0031339-9

PLAN DE TRABAJO

Señores:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND (AMPB)

Plan de Trabajo Técnico para la Instalación de Tubería de 4" en PVC en los SECTORES
EDUARDO BRITO I & II Y LA POLONIA. ITEM 10.

1. Evaluación y Planificación:

- Se llevará a cabo una reunión con el equipo de trabajo y especialistas para revisar los detalles del proyecto y definir los objetivos y plazos.
- Un estudio del terreno será realizado para obtener los planos del área y así identificar posibles obstáculos, determinando la ubicación exacta de la instalación de la tubería.

2. Preparación del Sitio:

- Se procederá con la limpieza y despeje del área donde se instalará la tubería, retirando la vegetación y otros elementos que puedan interferir con la excavación.
- La trayectoria de la tubería y los puntos de inicio y finalización de la instalación serán claramente marcados.

3. Excavación con Retropala:

- La maquinaria de excavación, como una retropala, será movilizada para llevar a cabo la excavación de la zanja de acuerdo con las especificaciones y profundidad requerida para la tubería de 4".
- Durante la excavación, se mantendrá un control preciso de la profundidad y la alineación de la zanja.

4. Colocación de Tubería de 4" en PVC:

- La tubería de PVC con un diámetro de 4" y una clasificación adecuada de presión para la aplicación específica será suministrada y colocada cuidadosamente en la zanja, asegurándose de que esté nivelada y alineada correctamente.

5. Corchón de Arena:

- Se procederá a colocar un corchón de arena de aproximadamente 5 cm de espesor debajo de la tubería, proporcionando una base uniforme y evitando daños durante el relleno y compactación.
- Se verificará que la tubería esté correctamente asentada en el corchón de arena.

8169

ENRIQUE CESPEDES GUZMAN

C/1ra, No.5, La Yuca, Los Girasoles, Santo Domingo.
Telf. 849-916-8799, 809-714-9195, CED. 071-0031339-9

6. Relleno de Reposición con Material Granular:

- La zanja será rellena con material granular, como grava o arena, cuidadosamente alrededor de la tubería, asegurando un llenado uniforme.
- El relleno será compactado en capas utilizando equipos adecuados para garantizar una densidad óptima y estabilidad de la zanja.

7. Control de Calidad y Supervisión:

- Inspecciones y pruebas de calidad se llevarán a cabo en cada etapa del proceso para asegurar que la instalación de la tubería cumpla con los estándares y especificaciones establecidos.
- Se verificará que no haya fugas ni daños en la tubería durante la instalación y el relleno.

8. Prueba de Presión:

- Se procederá a realizar una prueba de presión en la tubería para verificar su resistencia y hermeticidad antes de la puesta en funcionamiento.
- Se asegurará que la tubería mantenga la presión requerida sin pérdidas significativas durante la prueba.

9. Terminación y Limpieza:

- Los acabados finales, como el sellado de las juntas y la colocación de tapas y conexiones necesarias, serán realizados.
- Una limpieza final del área será llevada a cabo, retirando los escombros y garantizando la seguridad y accesibilidad en el entorno.

10. Documentación y Entrega:

- La documentación técnica y los informes finales que detallen los procedimientos y resultados del trabajo realizado serán preparados.
- El proyecto finalizado, incluyendo la instalación de la tubería de 4" en PVC, junto con la documentación requerida, será entregado al cliente o entidad responsable.

Este plan de trabajo técnico asegurará una instalación adecuada y eficiente de la tubería de 4" en PVC, cumpliendo con los requisitos técnicos y garantizando la calidad y durabilidad del sistema. El equipo de trabajo capacitado y especializado llevará a cabo las actividades bajo estrictas medidas de seguridad y control de calidad para lograr resultados óptimos

Los trabajos serán realizados de forma secuencial de acuerdo al cronograma anexo y/o a los requerimientos del ayuntamiento municipal de Pedro Brand.

Sin otro particular se despide


Ing. Enrique Céspedes Guzmán

ENRIQUE CESPEDES GUZMAN

C/1ra, No.5, La Yuca, Los Girasoles, Santo Domingo.
Telf. 849-916-8799, 809-714-9195, CED. 071-0031339-9

METODOLOGIA

Señores:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND (AMPB)

Plan de Trabajo Técnico para la Instalación de Tubería de 4" en PVC en los SECTORES
EDUARDO BRITO I & II Y LA POLONIA. ITEM 10.

Metodología de Trabajo para la Instalación de Tubería de 4" en PVC:

1. Evaluación y Diseño:

- Se llevará a cabo un estudio del área por parte del equipo técnico para determinar la ubicación y trazado óptimo de la tubería de 4" en PVC.
- El diseño del sistema de tuberías se realizará considerando las especificaciones técnicas y los requerimientos de presión establecidos.

2. Preparación del Sitio:

- El equipo técnico procederá a limpiar el terreno, removiendo obstáculos y marcando la ruta precisa de la tubería.
- Se preparará la zona para la excavación, asegurando las condiciones adecuadas para el proceso.

3. Excavación y Colocación:

- Se llevará a cabo la excavación de la zanja con la profundidad y dimensiones necesarias para alojar la tubería de 4" en PVC.
- La tubería de PVC será colocada en la zanja, y se conectarán las piezas con juntas herméticas para garantizar la integridad del sistema

4. Corchón de Arena:

- Se dispondrá un corchón de arena debajo de la tubería para proporcionar una base estable y proteger la tubería durante la instalación.

5. Relleno y Compactación:

- La zanja será rellena con material granular para proteger y estabilizar la tubería.
- Se llevará a cabo la compactación del relleno en capas para prevenir asentamientos futuros.

6. Pruebas y Control de Calidad:

- Se realizarán pruebas de presión para verificar la hermeticidad y la resistencia del sistema de tuberías.

ECG

ENRIQUE CESPEDES GUZMAN

C/1ra, No.5, La Yuca, Los Girasoles, Santo Domingo.
Telf. 849-916-8799, 809-714-9195, CED. 071-0031339-9

- El equipo técnico realizará inspecciones de calidad para asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas.
7. Terminación y Entrega:
- Se procederá a completar la instalación con los acabados requeridos, incluyendo el sellado de juntas y la colocación de tapas y conexiones.
 - La documentación técnica y los certificados de calidad serán entregados al cliente.

Esta metodología garantizará una instalación eficiente y duradera de la tubería de 4" en PVC, cumpliendo con los estándares técnicos de ingeniería y asegurando la correcta operación del sistema. El equipo técnico altamente capacitado se encargará de llevar a cabo cada etapa del proceso con precisión y profesionalismo, asegurando el éxito del proyecto.

Los trabajos serán realizados de forma secuencial de acuerdo al cronograma anexo y/o a los requerimientos del ayuntamiento municipal de Pedro Brand.

Sin otro particular se despide

Ing. Enrique Céspedes Guzmán

DOCUMENTACION TECNICA

ITEM 11. SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN DE TOSCA LOS COROZOS, EL CATALÁN Y LA MINA.

ENRIQUE CESPEDES GUZMAN

C/1ra, No.5, La Yuca, Los Girasoles, Santo Domingo.
Telf. 849-916-8799, 809-714-9195, CED. 071-0031339-9

OFERTA TECNICA

Señores:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND (AMPB)

Por medio de la presente me dirijo para dar informe de las característica de los materiales, condiciones de mano de obra y técnicas aplicar para la " **Suministro y compactación de Tosca Los Corozos, El Catalán y La Mina. ITEMS 11**

Se aplicarán los precios, salarios y condiciones de mano de obra establecidos en las resoluciones **CNS-03-2022 & CNS-05- 2022**, emitidas por el Ministerio de Trabajo y el Gobierno de la Republica Dominicana.

Se realizara un corte del material inservible con un espesor de 20 cm.

Se hará una limpieza del área de trabajo, y se realizara el bote de todo el material cortado.

El material de relleno será extraído de minas aprobadas por el ministerio de medio ambiente.

El material a utilizar como rellano cumplirá con las especificaciones técnicas establecidas en los reglamentos R.014 Y R-033.


El relleno se hará en finas capas que garanticen una mayor compactación.

Para garantizar la compactación del material, estaremos haciendo la prueba de compactación Proctor. Para su realización estaremos contratando un laboratorio de mecánica de suelos certificado por el ministerio de obras públicas.

Mano de Obra.: Para la realización de los trabajos contamos con un personal técnico altamente calificado con más de 20 años de experiencia en la realización de este tipo de obras.

Para la supervisión de los trabajos tendremos un ingeniero residente, el cual cuenta con vasta experiencia en la realización de este tipo de actividades.

Sin otro particular se despide.


Ing. Enrique Céspedes Guzmán
Representante Técnico

ENRIQUE CESPEDES GUZMAN

C/1ra, No.5, La Yuca, Los Girasoles, Santo Domingo.
Telf. 849-916-8799, 809-714-9195, CED. 071-0031339-9

PLAN DE TRABAJO

Señores:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND (AMPB)

El siguiente es el plan de trabajo para llevar a cabo las actividades en el Suministro y compactación de Tosca Los Corozos, El Catalán y La Mina. ITEMS 11

1. Evaluación y Planificación:

- Se realizará una reunión con el equipo de trabajo y supervisores para revisar los detalles del proyecto y establecer los objetivos y plazos.
- Se llevará a cabo una inspección del área para evaluar las condiciones del terreno y las posibles restricciones.

2. Preparación del Sitio:

- Se procederá con la limpieza y despeje del área donde se realizarán las actividades.
- Se marcarán las áreas destinadas al corte de material y para el almacenamiento del material cortado.

3. Corte de Material Inservible en Calles:

- Se movilizará la maquinaria y equipos necesarios para el corte, como excavadoras y camiones volquete.
-
- Se llevará a cabo la ejecución del corte de material hasta alcanzar la profundidad de 0.20 m según las especificaciones, generando un volumen total de 596.67m³.
- El material cortado se almacenará en el "Bote Material Cortado de 0 a 5 km", con un volumen de 30% expuesto, correspondiente a 775.67m³.

4. Suministro y Compactado de Tosca:

- Se realizará la adquisición de la cantidad necesaria de tosca para realizar el relleno compactado, que corresponde a un volumen de 895.00 m³.
- Se movilizará la maquinaria adecuada para el suministro y la compactación de la tosca en las calles.

5. Relleno Compactado con Material Granular:

- Se llevará a cabo el relleno compactado utilizando la tosca suministrada, llevando el relleno a una profundidad de 0.30 m, como se especifica en el proyecto.

ECG

ENRIQUE CESPEDES GUZMAN

C/1ra, No.5, La Yuca, Los Girasoles, Santo Domingo.
Telf. 849-916-8799, 809-714-9195, CED. 071-0031339-9

6. Control de Calidad y Supervisión:
 - Se realizarán inspecciones regulares para garantizar que todas las actividades se realicen de acuerdo con las normas y especificaciones del proyecto.
 - Se llevarán a cabo pruebas de calidad para verificar el nivel de compactación del relleno y asegurar que cumpla con los requisitos establecidos.
7. Gestión de Residuos:
 - Se implementará un manejo adecuado de los residuos generados durante el corte y la compactación, garantizando su disposición adecuada y cumpliendo con las regulaciones ambientales.
8. Seguridad en el Sitio:
 - Se tomarán medidas de seguridad para proteger al personal y a los transeúntes durante la ejecución de las actividades.
 - Se asegurará el uso de equipo de protección personal y señalización adecuada para advertir sobre las áreas de trabajo.
9. Cronograma y Seguimiento:
 - Se elaborará un cronograma detallado con fechas clave para cada actividad.
 - Se realizará un seguimiento periódico del progreso del proyecto para asegurar que se cumplan los plazos establecidos.
10. Finalización y Entrega:
 - Se realizará una revisión final del trabajo completado para verificar que se cumplan todos los requisitos del proyecto.
 - Se entregará el proyecto terminado a los responsables y autoridades pertinentes.

Los trabajos serán realizados de forma secuencial de acuerdo al cronograma anexo y/o a los requerimientos del ayuntamiento municipal de Pedro Brand.

Sin otro particular se despide.



Ing. Enrique Céspedes Guzmán
Representante Técnico

ENRIQUE CESPEDES GUZMAN

C/1ra, No.5, La Yuca, Los Girasoles, Santo Domingo.
Telf. 849-916-8799, 809-714-9195, CED. 071-0031339-9

METODOLOGIA

Señores:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND (AMPB)

Mediante la presente les presentamos la Metodología Técnica para la ejecución de " Suministro y compactación de Tosca Los Corozos, El Catalán y La Mina.- ITEM 11: Corte de Material Inservible, Bote Material Cortado de 0 a 5 km 30% exp., Relleno Compactado con Material Granular E = 0.30m en calles.

Evaluación y Planificación:

- 1.1. Se llevará a cabo un estudio topográfico detallado del área por parte del equipo de ingeniería para identificar las características del terreno y suelos existentes, determinando la ubicación precisa del corte y el relleno.
- 1.2. Los planos y especificaciones técnicas proporcionadas en el proyecto serán analizados por el equipo de ingeniería para comprender los criterios de corte y relleno, profundidades, volúmenes y ubicaciones específicas.

Diseño de Corte y Relleno:

- 2.1. Con base en la información obtenida en la evaluación, se diseñará un plan de corte que defina las áreas donde se removerá el material inservible hasta la profundidad de 0.20m, respetando las restricciones y evitando afectar las estructuras subyacentes.
- 2.2. El área de almacenamiento de material cortado ("Bote Material Cortado de 0 a 5 km 30% exp.") será diseñada para mantener el volumen requerido y asegurar la estabilidad del material almacenado.
- 2.3. El diseño del relleno con tosca en las calles será definido, determinando la profundidad de 0.30m y estableciendo los puntos de control para asegurar una compactación uniforme.

Preparación del Sitio:

- 3.1. Se realizará la limpieza y despeje del área de trabajo, eliminando vegetación, escombros y cualquier obstáculo que pudiera interferir con las actividades de corte y relleno.
- 3.2. Las áreas designadas para el corte, almacenamiento de material cortado y el relleno serán marcadas claramente utilizando estacas o pintura en el terreno.

Corte de Material Inservible:

- 4.1. Se movilizará maquinaria especializada, como excavadoras, para realizar el corte del material inservible en las calles. La profundidad del corte se ajustará según las especificaciones del proyecto, que es de 0.20 metros.



ENRIQUE CESPEDES GUZMAN

C/1ra, No.5, La Yuca, Los Girasoles, Santo Domingo.
Telf. 849-916-8799, 809-714-9195, CED. 071-0031339-9

4.2. El proceso de corte será controlado mediante estaciones de control topográfico para asegurar que se alcance la profundidad requerida y se mantengan los niveles adecuados.

Almacenamiento en el "Bote Material Cortado de 0 a 5 km 30% exp.":

5.1. El material cortado será cargado en camiones volquete y transportado cuidadosamente hasta el "Bote Material Cortado" ubicado a una distancia no mayor de 5 km del punto de corte.

5.2. Se distribuirá el material en el bote de manera uniforme y compacta, asegurando que se alcance el volumen necesario para cumplir con el 30% expuesto.

Suministro de Tosca para Relleno:

6.1. Se procederá al pedido de tosca de alta calidad, que cumpla con los criterios de granulometría y características técnicas requeridas para el relleno.

6.2. La tosca será transportada a la zona de trabajo y almacenada en áreas previamente preparadas, evitando la contaminación o alteración de la calidad del material.

Relleno Compactado con Material Granular:

7.1. Se utilizará maquinaria de compactación adecuada, como compactadoras de rodillo liso o neumático, para realizar el relleno de las áreas excavadas con la tosca suministrada.

7.2. Se establecerán puntos de control para la medición de densidad y compactación, asegurando que el relleno alcance la densidad mínima especificada en el proyecto.

Control de Calidad y Supervisión:

8.1. Se llevarán a cabo inspecciones continuas durante todo el proceso de corte y relleno para garantizar el cumplimiento de los criterios técnicos y especificaciones del proyecto.

8.2. Se realizarán pruebas de densidad in-situ utilizando el método del núcleo y se verificará que el relleno compactado cumpla con los requisitos establecidos.

Gestión de Residuos y Limpieza Final:

9.1. Se gestionarán adecuadamente los residuos generados durante el corte y la compactación, siguiendo las regulaciones ambientales y de manejo de desechos.

9.2. Al finalizar los trabajos, se llevará a cabo una limpieza exhaustiva, retirando cualquier material excedente y dejando el área en condiciones óptimas.

Seguridad en el Sitio:

10.1. Se implementarán estrictas medidas de seguridad en el sitio de trabajo, incluyendo el uso de equipos de protección personal, señalización y medidas de prevención de accidentes.

Informes y Entrega:

11.1. Se elaborarán informes periódicos sobre el progreso del trabajo y los resultados de las pruebas de control de calidad.

11.2. Se entregará al cliente un informe final que incluya documentación técnica, resultados de pruebas y certificados de calidad que validen el cumplimiento exitoso de las actividades.

ENRIQUE CESPEDES GUZMAN

C/1ra, No.5, La Yuca, Los Girasoles, Santo Domingo.
Telf. 849-916-8799, 809-714-9195, CED. 071-0031339-9

Esta metodología garantizará una ejecución eficiente y técnica de los trabajos de "Suministro y Compactado de Tosca en Calle Duarte Vieja, Pedro Brand" - ITEM 5, asegurando la calidad y la conformidad con los estándares de ingeniería establecidos. El equipo de ingenieros altamente capacitado y especializado en trabajos de construcción se compromete a llevar a cabo estas actividades cumpliendo con los más altos estándares profesionales. En caso de tener alguna consulta adicional o requerir más información técnica, se encuentra a disposición para proporcionarla.

Sin otro particular se despide.



Ing. Enrique Céspedes Guzmán
Representante Técnico

ENRIQUE CESPEDES GUZMAN

C/1ra, No.5, La Yuca, Los Girasoles, Santo Domingo.
Telf. 849-916-8799, 809-714-9195, CED. 071-0031339-9

OBRA: ITEM 5. 2DA ETAPA SUMINISTRO Y COMPACTADO DE TOSCA EN CALLE DUARTE VIEJA, PEDRO BRAND

UBICACIÓN: DUARTE VIEJA DEL MUNICIPIO PEDRO BRAND.

LISTADO DE PARTIDAS

Nº	DESCRIPCION	CANT.	UD	P/U	VALOR	TOTAL
I	PRELIMINARES					
1.01	Señalización y seguridad	1.00	P.A.		-	-
II	Calles Sector L = m.					
2.01	Corte de Material Inerbible en calles E= 0.20m	224.40	m3		-	
2.02	Bote Material Cortado de 0 a 5 km 30% exp.	290.40	m3		-	
2.03	Relleno compactado con Material Granular E = 0.30m en calles	354.00	m3		-	0.00
III-	LIMPIEZA FINAL					
3.01	Limpieza final y bote	1.00	P.A.		-	0.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS						0.00

GASTOS INDIRECTOS

SEGUROS Y FIANZAS	4.50%	-	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	-	
DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL	10.00%	-	
TRANSPORTE	2.50%	-	
SUPERVISION	5.00%	-	
LEY 686	1.00%	-	
ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)	18.00%	-	
CODIA	0.10%	-	0.00

TOTAL GENERAL PRESUPUESTO

0.00

Preparado Por:



ING. ENRIQUE CESPEDES GUZMAN
Codia 17062

27 de julio del 2023

ENRIQUE CESPEDES GUZMAN

C/1ra, No.5, La Yuca, Los Girasoles, Santo Domingo.
Telf. 849-916-8799, 809-714-9195, CED. 071-0031339-9

OBRA: ITEM 10. INSTALACION DE TUBERIAS LA ESPERANZA.

UBICACIÓN: SECTORES EDUARDO BRITO I & II Y LA POLONIA.

LISTADO DE PARTIDAS

Nº	DESCRIPCION	CANT.	UD	P/U	VALOR	TOTAL
I	PRELIMINARES					
1.01	Señalización y seguridad	1.00	P.A.		-	-
II	INSTALACION DE TUBERIA					
	Instalacion de tuberia de 4" pulgadas incluye (Exavacion con retropala, tuberia de 4"					
2.01	presion, corchon de arena, relleno de reposicion compactado con material granular).	52.00	ml		-	0.00
III-	LIMPIEZA FINAL					
3.01	Limpieza final y bote	1.00	P.A.		-	0.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS						0.00

GASTOS INDIRECTOS

SEGUROS Y FIANZAS	4.50%	-	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	-	
DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL	10.00%	-	
TRANSPORTE	2.50%	-	
SUPERVISION	5.00%	-	
LEY 686	1.00%	-	
ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)	18.00%	-	
CODIA	0.10%	-	0.00

TOTAL GENERAL PRESUPUESTO

0.00

Preparado Por:

ING. ENRIQUE CESPEDES GUZMAN

Codia 17062

27 de julio del 2023

ENRIQUE CESPEDES GUZMAN

C/1ra, No.5, La Yuca, Los Girasoles, Santo Domingo.
Telf. 849-916-8799, 809-714-9195, CED. 071-0031339-9

OBRA: ITEM 11. Suministro y Compactacion de Tosca Los Corozos, El Catalán y La Mina.

UBICACIÓN: SECTORES LOS COROZOS, EL CATALAN Y LA MINA DEL MUNICIPIO DE PEDRO BRAND.

LISTADO DE PARTIDAS

Nº	DESCRIPCION	CANT.	UD	P/U	VALOR	TOTAL
I	PRELIMINARES					
1.01	Señalización y seguridad	1.00	P.A.		-	-
II	Calles Sector L = m.					
2.01	Corte de Material Inerible en calles E= 0.20m	596.67	m3		-	
2.02	Bote Material Cortado de 0 a 5 km 30% exp.	775.67	m3		-	
2.03	Relleno compactado con Material Granular E = 0.30m en calles	895.00	m3		-	0.00
III-	LIMPIEZA FINAL					
3.01	Limpieza final y bote	1.00	P.A.		-	0.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS						0.00

GASTOS INDIRECTOS

SEGUROS Y FIANZAS	4.50%	-	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%	-	
DIRECCION TECNICA Y REPS. CIVIL	10.00%	-	
TRANSPORTE	2.50%	-	
SUPERVISION	5.00%	-	
LEY 686	1.00%	-	
ITBIS (DIRECCION TECNICA O BENEFICIOS)	18.00%	-	
CODIA	0.10%	-	0.00

TOTAL GENERAL PRESUPUESTO

0.00


Preparado Por:

ING. ENRIQUE CESPEDES GUZMAN

Codia 17062

27 de julio del 2023

Pag.1/1

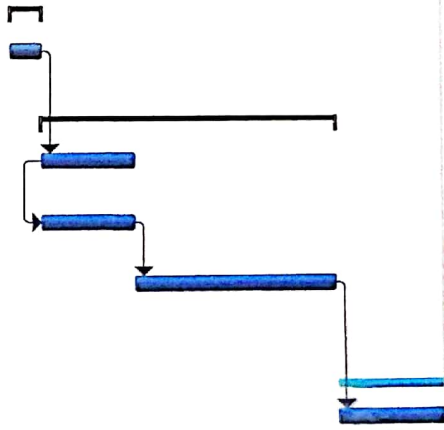ITEM. 5 ENRIQUE CESPEDES																																																										
Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	04 sep '2311 sep '2318 sep '23																																																					
					S	X	D	J	L																																																	
1																																																										
2	1 OBRA: ITEM 5. 2DA ETAPA SUMINISTRO Y COMPACTADO DE TOSCA EN CALLE DUARTE VIEJA, PEDRO BRAND	11 días?	mar 05-09-23	lun 18-09-23																																																						
3																																																										
4	1.1 PRELIMINARES	1 día	mar 05-09-23	mar 05-09-23																																																						
5	1.1.1 Señalización y seguridad	1 día	mar 05-09-23	mar 05-09-23																																																						
6																																																										
7	1.2 Calles Sector L = m.	8 días	mié 06-09-23	vie 15-09-23																																																						
8	1.2.1 Corte de Material Inserbible en calles E= 0.20m	3 días	mié 06-09-23	vie 08-09-23																																																						
9	1.2.2 Bote Material Cortado de 0 a 5 km 30% exp.	3 días	mié 06-09-23	vie 08-09-23																																																						
10	1.2.3 Relleno compactado con Material Granular E = 0.30m en calles	5 días	sáb 09-09-23	vie 15-09-23																																																						
11																																																										
12	1.3 LIMPIEZA FINAL																																																									
13	1.3.1 Limpieza final y bote	2 días	vie 15-09-23	lun 18-09-23																																																						
<table><tr><td rowspan="8">Ing. Enriquez Cespedes</td><td>Tarea</td><td></td><td>Tarea manual</td><td></td><td>Fecha límite</td><td></td></tr><tr><td>División</td><td></td><td>solo duración</td><td></td><td>Tareas críticas</td><td></td></tr><tr><td>Hito</td><td></td><td>Informe de resumen manual</td><td></td><td>División crítica</td><td></td></tr><tr><td>Resumen</td><td></td><td>Resumen manual</td><td></td><td>Línea base</td><td></td></tr><tr><td>Resumen del proyecto</td><td></td><td>solo el comienzo</td><td></td><td>Hito de línea base</td><td></td></tr><tr><td>Tarea inactiva</td><td></td><td>solo fin</td><td></td><td>Resumen de línea base</td><td></td></tr><tr><td>Hito inactivo</td><td></td><td>Tareas externas</td><td></td><td>Progreso</td><td></td></tr><tr><td>Resumen inactivo</td><td></td><td>Hito externo</td><td></td><td>Progreso manual</td><td></td></tr></table>										Ing. Enriquez Cespedes	Tarea		Tarea manual		Fecha límite		División		solo duración		Tareas críticas		Hito		Informe de resumen manual		División crítica		Resumen		Resumen manual		Línea base		Resumen del proyecto		solo el comienzo		Hito de línea base		Tarea inactiva		solo fin		Resumen de línea base		Hito inactivo		Tareas externas		Progreso		Resumen inactivo		Hito externo		Progreso manual	
Ing. Enriquez Cespedes	Tarea		Tarea manual		Fecha límite																																																					
	División		solo duración		Tareas críticas																																																					
	Hito		Informe de resumen manual		División crítica																																																					
	Resumen		Resumen manual		Línea base																																																					
	Resumen del proyecto		solo el comienzo		Hito de línea base																																																					
	Tarea inactiva		solo fin		Resumen de línea base																																																					
	Hito inactivo		Tareas externas		Progreso																																																					
	Resumen inactivo		Hito externo		Progreso manual																																																					
Página 1																																																										

ITEM. 5 ENRIQUE CESPEDES

18 sep '23			25 sep '23			02 oct '23			09 oct '23			16 oct '23			23 oct '23			30 oct '23			06 nov '23			13			
L		V		M		S		X		D		J		L		V		M		S		X		D		J	

18-09

Ing. Enrique Cespedes

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo



Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo



Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso

Progreso manual



ELABORADO POR: ING. ENRIQUE CESPEDES

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	07 ago '23							21 ago '23		
					V	M	S	X	D	J	L	V		
1	1 OBRA: ITEM 10. INSTALACION DE TUBERIAS LA ESPERANZA.													
2														
3		15 días	mar 01-08-23	vie 18-08-23										18-08
4														
5		1.1 PRELIMINARES	1 día	mar 01-08-23	mar 01-08-23									
6	1.1.1 Señalización y seguridad	1 día	mar 01-08-23	mar 01-08-23										
7														
8	1.2 INSTALACION DE TUBERIA	14 días	mié 02-08-23	vie 18-08-23										
9	1.2.1 Instalacion de tuberia de 4" pulgadas incluye (Exavacion con retropala, tubería de 4" presion, corchon de arena, relleno de reposicion compactado con material granular).	14 días	mié 02-08-23	vie 18-08-23										
10														
11	1.3 LIMPIEZA FINAL	3 días	sáb 05-08-23	mié 09-08-23										
12	1.3.1 Limpieza final y bote	3 días	sáb 05-08-23	mié 09-08-23										

Proyecto: Proyecto1 Cronogram
Fecha: vie 28-07-23

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso

Progreso manual

ELABORADO POR: ING. ENRIQUE CESPEDES

03				04 sep '23				18 sep '23				02 oct '23				16 oct '23				30 oct '23				13 nov '23			
V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M	S	X	D	J	L	V	M					

Proyecto: Proyecto1 Cronogram
Fecha: vie 28-07-23

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo



Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo



Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base


Progreso

Progreso manual



ELABORADO POR: ING. ENRIQUE CESPEDES

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	04 sep '23		11 sep '23		18 sep '23	
					S	X	D	J	L	
1	1 OBRA: ITEM 11. Suministro y Compactacion de Tosca Los Corozos, El Catalán y La Mina.	13 días?	mar 05-09-23	mié 20-09-23						
2										
3										
4										
5	1.1 PRELIMINARES	1 día	mar 05-09-23	mar 05-09-23						
6	1.1.1 Señalización y seguridad	1 día	mar 05-09-23	mar 05-09-23						
7										
8	1.2 Calles Sector L = m.	10 días	mié 06-09-23	lun 18-09-23						
9	1.2.1 Corte de Material Inerbible en calles E= 0.20m	5 días	mié 06-09-23	mar 12-09-23						
10	1.2.2 Bote Material Cortado de 0 a 5 km 30% exp.	5 días	mié 06-09-23	mar 12-09-23						
11	1.2.3 Relleno compactado con Material Granular E = 0.30m en calles	5 días	mar 12-09-23	lun 18-09-23						
12										
13	1.3 LIMPIEZA FINAL	2 días	mar 19-09-23	mié 20-09-23						
14	1.3.1 Limpieza final y bote									

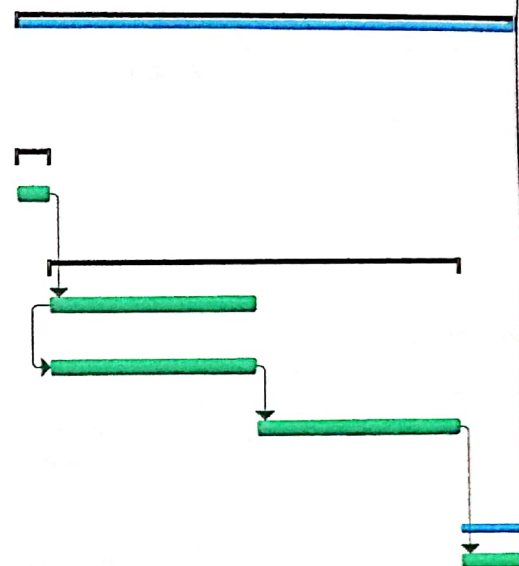

Proyecto: Proyecto1 Cronogram
Fecha: vie 28-07-23

Tarea		Tarea manual		Fecha límite	
División		solo duración		Tareas críticas	
Hito		Informe de resumen manual		División crítica	
Resumen		Resumen manual		Línea base	
Resumen del proyecto		solo el comienzo		Hito de línea base	
Tarea inactiva		solo fin		Resumen de línea base	
Hito inactivo		Tareas externas		Progreso	
Resumen inactivo		Hito externo		Progreso manual	

SNCC.D.049



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO
BRAND (AMPB)**

EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

No. EXPEDIENTE

AMPB-CCC-CP-2023-0002

Fecha: 27 de julio de 2023

Página 1 de 2

Nombre del Oferente: ING. ENRIQUE CESPEDES GUZMAN
Relación de contratos de naturales y magnitud similares realizados durante los últimos [10] años.

Título del proyecto	Valor total del proyecto del que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% del proyecto completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (P) o Subcontratista (S)	¿Certificación definitiva expedida? - Sí -Aún No (contratos en curso)-No
Construcción de Contenes, preparación de sub-base, base de la calle Enriquillo, ubicadas en el sector Villa Palmar,	3,354,546.65	15 Meses	Feb. 2012	100%	AYUNTAMIENTO PANTOJA	P	SI
Construcción de Contenes, badenes, preparación de sub-base, base de las calles Ramón Matías Mella, Profesor Juan Bosch, Respaldo profesor Juan Bosch, ubicadas en el sector Villa Morada	2,125,156.25	15 Meses	Feb. 2012	100%	AYUNTAMIENTO PANTOJA	P	Si

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras



/UR.02.2014

313

Trabajos de Limpieza, escarificación, relleno, regado y compactación en el bloque SUR I, del municipio de los Alcarrizos. Sávida Toronja, Sávida- 5 esquinas, 24 de abril, Libertador, Paraíso, Play Vivero, Valle Encantado, Canaán, Las Mercedes, (Bloque Sur I) Perteneciente al plan Pro Asfalto 2015	3,435,525.65	1 Año	Marzo 2021	100%	AYUNTAMIENTO DE LOS ALCARRIZOS	P	SI
Colocación de Tubería de Agua Potable en el Sector de Hato Nuevo, Villa Linda	2,246,358.25	2 Meses	Abril 2021	100%	AYUNTAMIENTO DE LOS ALCARRIZOS	P	SI
Construcción de aceras, contenes y badenes en diferentes calles del Barrio Villa Los Peloteros, Alcarrizos Viejo (01), Perteneciente a las aceras, contenes, badenes, relleno, alcantarillados, Imprimación de las calles, puente, plan –Pro Asfalto.	2,145,325.32	5 Meses	Sep 2020	100%	AYUNTAMIENTO DE LOS ALCARRIZOS	P	SI
Relleno y Construcción de aceras, contenes y badenes en la C/ Primavera desde la C/ Duarte hasta la Entreda al barrio los Coquitos, Perteneciente al Relleno de calles y mantenimiento vial del municipio los Alcarrizos	3,351,156.32	8 Meses	Oct. 2021	100%	AYUNTAMIENTO DE LOS ALCARRIZOS	P	SI

Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los Órganos de Contratación correspondientes en..... folios adjuntos.

Firma

/UR.02.2014



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras





JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Departamento de Obras Públicas

Distrito Municipal Pantoja
26 de noviembre del 2013

CERTIFICACION DE RECEPCION DE OBRA

Por medio de la presente informamos que hemos recibido satisfactoriamente los trabajos ejecutados por el **Ingeniero Enrique Céspedes Guzmán** con RNC 131309313 correspondientes a la Construcción de Contenes, preparación de sub-base, base de la calle Enriquillo, ubicadas en el sector Villa Palmar, dichos trabajos fueron ejecutados en su totalidad conforme a los requerimientos de la institución y al presupuesto de la obra.

Estos trabajos fueron ejecutados desde febrero 2012 hasta mayo 2013

Esta Certificación se expide a solicitud de parte interesada a los 26 días del mes de noviembre del 2013 Distrito Municipal de Pantoja, Provincia Santo Domingo.

Atentamente:

Ing. Jorge Á. Peña
Encargado de Obras Públicas





JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Departamento de Obras Públicas

Distrito Municipal Pantoja
26 de noviembre del 2013

CERTIFICACION DE RECEPCION DE OBRA

Por medio de la presente informamos que hemos recibido satisfactoriamente los trabajos ejecutados por el **Ingeniero Enrique Cespedes Guzmán** con RNC **131309313** correspondientes a la Construcción de Contenes, badenes, preparación de sub-base, base de las calles Ramon Matías Mella, Profesor Juan Bosch, Respaldo profesor Juan Bosch, ubicadas en el sector Villa Morada, dichos trabajos fueron ejecutados en su totalidad conforme a los requerimientos de la institución y al presupuesto de la obra.

Estos trabajos fueron ejecutados desde febrero 2012 hasta mayo 2013

Esta Certificación se expide a solicitud de parte interesada a los 26 días del mes de noviembre del 2013 Distrito Municipal de Pantoja, Provincia Santo Domingo.

Atentamente:

Inq. Jorge Á. Peña
Encargado de Obras Públicas



Av. La Isabela Esq. Palma Real, Plaza Espedito No.1 Distrito Municipal Pantoja, Municipio de los Alcarrazos
Santo Domingo, R.D. /RNC430044741 Tel.:809-333-3581 •www.juntapantoja.gov.do •http://juntamunicipalpantoja@hotmail.com



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE LOS ALCARRIZOS
GESTIÓN 2020-2024

📍 Calle Duarte #359, Los Alcarrazos
📧 ayuntamiento@alcarrazos.gob.do
☎ 809-363-2736

Dirección de Obras Públicas Municipales

DOCP-0099-2023

Municipio Los Alcarrazos,
Provincia Santo Domingo.
07 de julio de 2023

CERTIFICACION

Por medio de la presente misiva, damos constancia de que **Ing. Enrique Céspedes Guzmán**, ejecuto los trabajos de Limpieza, escarificación, relleno, regado y compactación en el Bloque SUR 1, del municipio de los Alcarrazos. Sávida - Toronja, Sávida - 5 esquinas, 24 de Abril, Libertador, Paraíso, Play, Vivero, Valle Encantado, Canaán, las mercedes (Bloque Sur I) Perteneciente al Plan-Pro Asfalto 2015

Esta obra fue supervisada por el **Sr. César Paula Frías**, encargado de la Supervisión de la Dirección de Obras Públicas Municipales, Ayuntamiento Municipal Los Alcarrazos.

Esta información la ofrecemos a solicitud de la parte interesada, en el día de hoy, viernes 07 de julio de 2023.

Sin otro particular se despide:

Ing. Juan Carlos Rosario
Director de Obras Públicas Municipales,
Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrazos (AMA).
JR/jc

JC



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE LOS ALCARRIZOS
GESTIÓN 2020-2024

📍 Calle Duarte #359, Los Alcarrazos
✉ ayuntamiento@alcarrazos.gob.do
☎ 809-363-2736

Dirección de Obras Públicas Municipales

Municipio Los Alcarrazos,
Provincia Santo Domingo.
07 de julio de 2023

DOCP-0104-2023


CERTIFICACION

Por medio de la presente misiva, damos constancia de que **Ing. Enrique Céspedes Guzmán**, ejecuto los trabajos de **Colocación de Tubería de Agua Potable en el Sector de Hato Nuevo, Villa Linda**.

Esta obra fue supervisada por el **Sr. César Paula Frías**, encargado de la Supervisión de la Dirección de Obras Públicas Municipales, Ayuntamiento Municipal Los Alcarrazos.

Esta información la ofrecemos a solicitud de la parte interesada, en el día de hoy, viernes 07 de julio de 2023.

Sin otro particular se despide:



Ing. Juan Carlos Rosario
Director de Obras Públicas Municipales,
Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrazos (AMA).
JR/jc

JC



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE LOS ALCARRIZOS
GESTIÓN 2020-2024

📍 Calle Duarte #359, Los Alcarrazos
✉ ayuntamiento@alcarrazos.gob.do
☎ 809-363-2736

Dirección de Obras Públicas Municipales

DOCP-0097-2023

Municipio Los Alcarrazos,
Provincia Santo Domingo.
07 de julio de 2023

CERTIFICACION

Por medio de la presente misiva, damos constancia de que **Ing. Enrique Céspedes Guzmán**, ejecuto los trabajos de **Construcción de aceras contenes y badenes en diferente calles del Barrio Villa Los Peloteros, Alcarrazos Viejo (01), Perteneciente a las aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados, imprimación, señalización de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto.**

Esta obra fue supervisada por el **Sr. César Paula Frías**, encargado de la Supervisión de la Dirección de Obras Públicas Municipales, Ayuntamiento Municipal Los Alcarrazos.

Esta información la ofrecemos a solicitud de la parte interesada, en el día de hoy, viernes 07 de julio de 2023.

Sin otro particular se despide:

Ing. Juan Carlos Rosario
Director de Obras Públicas Municipales,
Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrazos (AMA).
JR/jc

JC



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE LOS ALCARRIZOS
GESTIÓN 2020-2024

📍 Calle Duarte #359, Los Alcarizos
✉ ayuntamiento@alcarizos.gob.do
☎ 809-363-2736

Dirección de Obras Públicas Municipales

DOCP-0098-2023

Municipio Los Alcarizos,
Provincia Santo Domingo.
07 de julio de 2023

CERTIFICACION

Por medio de la presente misiva, damos constancia de que **Ing. Enrique Céspedes Guzmán**, ejecuto los trabajos de **Relleno y Construcción de Aceras, Contenes y Badenes en la C/ Primavera Desde la C/ Duarte Hasta la Entrada al Barrio Los Coquitos, Perteneciente a RELLENO DE CALLES Y MANTENIMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS.**

Esta obra fue supervisada por el **Sr. César Paula Frías**, encargado de la Supervisión de la Dirección de Obras Públicas Municipales, Ayuntamiento Municipal Los Alcarizos.

Esta información la ofrecemos a solicitud de la parte interesada, en el día de hoy, viernes 07 de julio de 2023.

Sin otro particular se despide:

Ing. Juan Carlos Rosario
Director de Obras Públicas Municipales,
Ayuntamiento Municipal de Los Alcarizos (AMA).
JR/jc

JC



27 de julio de 2023

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO
BRAND (AMPB)****CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO****1. Cargo propuesto:** INGENIERO DIRECTOR DE PROYECTOS:**2. Nombre de la firma:** ENRIQUE CÉSPEDES GUZMÁN**3. Nombre del individuo:** ENRIQUE CÉSPEDES GUZMÁN**4. Fecha de nacimiento:** _ 15 de julio del 1975 **Nacionalidad:** __Dominicana__**5. Educación:**

- **Secundarios:** Colegio Salome Ureña.
- **Estudios universitarios:** O&M (Ing. Civil Graduado).

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:

Colegio dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (CODIA)

7. Otras especialidades:

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| ❖ Inglés: | Raul English School |
| ❖ Contabilidad: | Instituto Provincial (Nagua) |
| ❖ Cajero: | Colegio Salome Ureña |
| ❖ Sastrería: | Escuela Santana Ana |
| ❖ Ebanistería: | Escuela Vocacional |
| ❖ Liderazgo: | VIVE |

8. Países donde tiene experiencia de trabajo: Republica Dominicana**9. Idiomas:** Inglés (Regular)

/UR.10.2012

DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras

10. Historia Laboral

SUB CONTRATO DE MAGNA COMPREICA

- ❖ Proyecto. Pluvial Unphu (1999-2000)
- ❖ Proyecto. Elevado Churchill (1999-2001)
- ❖ Proyecto. Elevado Lincoln (1997-1998)
- ❖ Proyecto. Elevado Tiradentes (1999-2000)
- ❖ Proyecto. Elevado Máximo Gómez (2001-2002)
- ❖ Proyecto. Metálico KM. 18
- ❖ Proyecto. Las américas (marginal) (2002-2004)

SUPERVISOR: ING. ENRIQUE CESPEDES

- ❖ Proyecto. Carolina I (2005-2007)
- ❖ Proyecto. Carolina II (2006-2008)
- ❖ Proyecto. Plaza Miram (2006)
- ❖ Proyecto. Apartamental Manga Nagua (2003)
- ❖ Proyecto. Helen I (2005)
- ❖ Proyecto. Don Fidel (2004)
- ❖ Proyecto. Milagros

SUB-DIRECTOR DE OPERACIONES:

- ❖ Contrato De Obras: Acueducto De Sto. Dgo. (Caasd).
- ❖ Proyecto. Calle Landi (Los Alcarrizos)
- ❖ Proyecto. C/ Principal Guachapita
- ❖ Proyecto. Instalación diversas válvulas en diversos sectores.
- ❖ Proyecto. Palmarejo Villa Linda
- ❖ Proyecto. Villa linda
- ❖ Proyecto. Ayuntamiento Pantoja

PROYECTOS.

- ❖ Construcción de una verja de 300 metros en boque de 8 donde se selló y se construyó un drenaje de 72 año 1999-2000
- ❖ Construcciones de contenes, aceras y muros en la calle Máximo Gómez en los diversos elevados construidos consecutivos desde la Churchill hasta al Máximo Gomes des del 2000 al 2001 elevado Churchill elevado Lincoln.
- ❖ Construcción de oficina en el km 18 ubicado próximo a modesto en el año del 2000 al 2001.
- ❖ Construcción de naves metálicas, reparación de otras y construcción drenaje en el km 18 dentro del asfalto desde el año 2001 al 2002.
- ❖ Construcción de contenes y aceras en las américas desde el puente Juan Carlos hasta el peaje en el proyecto marginal de las américas desde el año 2003 al 2004.

/UR.10.2012

DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras



- ❖ Construcción de canaletas, muros y drenaje desde el puente Juan Carlos hasta el peaje proyecto la marginal de la américa del 2003-2004.

PROYECTO PALMAREJO VILLA LINDA.

- ❖ Construcción de contenes, aceras, badén, puente, cambios de tuberías, rellenos y botes de materiales en diversos lugares del distrito municipal del 2010 al 20117.

PROYECTO VILLA LINDA.

- ❖ Construcción de calle los rieles, contenes, aceras y relleno desde el Ole hasta Palmarejo desde el 2007 al 2008.

PROYECTO AYUNTAMIENTO PANTOJA

SUPERVISOR AGRIMEN. CHINGULO MARTINEZ (829-713-6943)

Programa de asfalto.

- ❖ Construcción en el barrio la redención contenes, aceras, e imprimación próxima al ayuntamiento y aplicación de asfalto años 2007.
- ❖ Construcción calle Juan Bosch, imprimación y aplicación de asfalto del 2012 al 2014.
- ❖ Barrio Villa Morada 2018 al 2019
- ❖ Barrio Villa el palma 2018 al 2019
- ❖ Barrio Progreso I 2018
- ❖ Barrio 23 construcciones de contenes, badenes, imprimación bote de materiales y aplicación de asfalto 2012 al 2014.
- ❖ Barrio la cruz construcción de contenes, aceras, afirmado de calles, bote de materiales,

PROYECTO AYUNTAMIENTO VILLA ALTAGRACIA. SUPERVISOR: EULOGIO LORENZO

- ❖ Construcciones de alcantarillas, aceras, afirmados, y bote de materiales bario la colina I año 2012.
- ❖ Construcción de puentes aceras, afirmado, en el barrio pajarito arriba en la Gregorio Días del año 2012 al 2015.
- ❖ Construcción de parque infantil bario duarte en año 2014-2015.
- ❖ Construcciones de aceras, contenes, badenes, en la calle Mauricio Báez, la filantrópica y la María Toledo del barrio la plata en el año 2018.
- ❖ Construcción de aceras, contiene y badenes en la calle la escuela Elizabeth del barrio paraíso I 2018.
- ❖ Acondicionamiento de la calle Francisco Mota, Fidelina Cachón Norte en el barrio mayor de ley en el año 2018.
- ❖ Construcción de la rehabilitación en la calle del barrio isabelita 2018.

DISTRIBUCIÓN
Original 1 - Expediente de Compras



UR.10.2012

- ❖ Construcción de acueducto de mamajaina (joa) en el 2018.
- ❖ Construcción de la calle del sector villa linda acera, contenes, y badenes 2018.
- ❖ Construcción de contenes, aceras, badenes en la calle la maquinaria barrio el silencio 2018.
- ❖ Demolición de contenes en el barrio Peña Gómez en el 2018.
- ❖ Construcción de aceras, contenes, en la calle del barrio 5to centenario parte alta 2018.

PROYECTO PLAN DE ASFALTO VILLA ALTAGRACIA 2019. SUPERVISOR: EULOGIO LORENZO (CEL. 809-949-9024).

- ❖ Calle Chales Girl desde el puente que divide la charle hasta la Emilio Prud'Homme
- ❖ construcción de aceras, badenes, afirmados, botes de materiales e imprimación 2019.
- ❖ Construcción afirmado de botes de materiales inservibles e imprimación en la calle cao-nabo desde la padre Billini hasta la estación 2019.
- ❖ Construcción de afirmado de botes de materiales inservibles e imprimación en la calle Gregorio Díaz desde la Jerónimo Mejía hasta la cao-nabo 2019.
- ❖ Construcción de afirmado de bote de materiales inservibles e imprimación en la calle Charle Girl 2019.
- ❖ Construcción y afirmado de botes y materiales inservibles e imprimación de la calle palosin desde la calle Cheles Girl hasta la estación 2019.
- ❖ Construcción y afirmado de botes y materiales inservibles e imprimación de la calle Gregorio Eves desde la challe Charle Girl hasta el final 2019.
- ❖ Construcción y afirmado de botes y materiales inservibles e imprimación en la respaldo Emilio Prud'Homme hasta la calle Prolongación Independencia 2019.
- ❖ Construcción y afirmado de botes y materiales inservibles e imprimación de la calle en la calle Mama Tingo desde la calle profesor Melanio Hernández hasta el final 2019.
- ❖ Construcción y afirmado de botes y materiales inservibles e imprimación en la calle Pedro Mir desde la calle Guarionex hasta el final 2019.
- ❖ Construcción y afirmado de botes y materiales inservibles e imprimación de la calle Buenos Aires desde la calle Gastón hasta el final 2019.
- ❖ Construcción de toda la calle del cementerio de Villa Altagracia con afirmado de botes de materiales e imprimación 2019.
- ❖ Construcción y afirmado de botes y materiales inservibles e imprimación de la calle el varón desde la avenida duarte hasta el final 2019.
- ❖ Construcción y afirmado de botes y materiales inservibles e imprimación de la calle respaldo Américo Lugo desde la filantrópica hasta el final 2019.
- ❖ Construcción y afirmado de botes y materiales inservibles e imprimación de la calle en la calle las 10 casitas 2019.

/UR.10.2012

DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras


- ❖ Construcción y afirmado de botes y materiales inservibles e imprimación de la calle Bacilo Girl hasta la delicia.
- ❖ Construcción y afirmado de botes y materiales inservibles de la calle los barrio la guásuma colina 4 2019.
- ❖ Demolición y construcción de contenes y badenes en la calle Melanio Hernández y Pedro Mir.

PROYECTO AYUNTAMIENTO LOS ALCARRIZOS. SUPERVISOR: ING. BOLIVAR VALERIO (CEL. 829-292-8405).

- ❖ Construcción de aceras, contenes, badenes en el barrio hatonuevo calle principal hasta villa linda 2007-2009.
- ❖ Construcción de aceras, contenes, rellenos e imprimación en la calle principal de Villa Linda 2007.
- ❖ Construcción de aceras, contenes, badenes e imprimación calle segunda que llega a la ciudad satélite 2008.
- ❖ Relleno de todas las calles de Villa Linda 2008.
- ❖ Construcción multiuso Villa Linda 2018.
- ❖ Relleno barrio el limón todas las calles 2007.
- ❖ Relleno barrio la piña 2007.
- ❖ Contenes y aceras calle la Esperanza 2010-2012.
- ❖ Construcción y aceras en el sector el progreso 2009-2011.
- ❖ Construcción contenes y aceras 2009-2012.
- ❖ Construcción de contenes aceras calle Luperón y otras en el año 2009-2013.
- ❖ Construcción de contenes aceras y badenes en la calle principal del Chabón 2009-2013.
- ❖ Construcción de drenaje en la calle segunda en la calle principal 2009-2013.
- ❖ Construcción calle primera del Invi contenes, badenes y aceras 2018.
- ❖ Construcción de todas las calles del nazareno contenes, aceras, badenes, rellenos e imprimación 2013-2016.

PLAN DE ASFALTO NAZARENO 2016. ING. BOLIVAR VALERIO (CEL. 829-292-8405).

- ❖ Calle 9
- ❖ Calle 2
- ❖ Calle 4
- ❖ Calle 5
- ❖ Calle Mama Tingo
- ❖ Calle 7
- ❖ Calle Respaldo 5

/UR.10.2012

DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras



- ❖ Calle Principal Nazareno
- ❖ Calle 33
- ❖ Calle 31
- ❖ Calle 21
- ❖ Calle 19
- ❖ Calle 20
- ❖ Calle 29
- ❖ Calle 14

PLAN DE ASFALTO SAVICA 2011. BOLIVAR VALERIO (CEL. 829-292-8405).

Se construyo contenes aceras badenes rellenos y botes de materiales e imprimacion, las calles son:

- ❖ Calle 10
- ❖ Calle 12
- ❖ Calle 14
- ❖ Calle 16
- ❖ Calle 18
- ❖ Calle 21
- ❖ Calle 25
- ❖ Calle 19
- ❖ Calle 23
- ❖ Calle Respaldo 10
- ❖ Calle Caridad
- ❖ Calle 7
- ❖ Calle 3
- ❖ Calle 15
- ❖ Calle 13

LOS CERRO PLAN DE ASFALTO 2018-2019. ING. CESAR FRIAS (CEL.829-650-7046).

Contruccion de contenes badenes, aceras, instalacion de drenaje pluvial y afirmado de botes de materiales inservibles e imprimacion.

- ❖ Calle 8
- ❖ Calle J
- ❖ Calle I
- ❖ Calle 28
- ❖ Calle E

/UR.10.2012

DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras



- ❖ Calle Respaldo E
- ❖ Calle D
- ❖ Calle 1ra
- ❖ Calle 2da
- ❖ Calle 3ra
- ❖ Calle La Duarte
- ❖ Calle 4
- ❖ Calle 5
- ❖ Calle la B
- ❖ Calle B
- ❖ Calle C

BARRIO TAMARINDO PLAN DE ASFALTO. BOLIVAR VALERIO (CEL. 829-292-8405)
Construccion de contenes aceras badenes bote de materiales inservibles e imprimacion ebn las siguientes calles.

- ❖ Calle La cereza
- ❖ Calle La Toronja
- ❖ Calle La Naranja
- ❖ Calle La principal
- ❖ Calle La 2da
- ❖ Calle La 3ra
- ❖ Calle El Limón

CALLE LOS COQUITOS.
Construccion badenes, rellenos y contenes.

- ❖ Calle 1ra
- ❖ Calle 2da

CALLE LOS PRADOS.

- ❖ Construcción de contenes badenes y confirmado 2014.
- ❖ Construcción de parqueo para vehículos al lado de la ferretería doña julia 2014.
- ❖ Construcción de Play en el hoyo de sabica en proceso de inicio 2019.

Handwritten signature

/UR.10.2012

DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras



13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

Enrique Céspedes Guzmán Fecha: 07-07-2023

Nombre completo del representante autorizado: ENRIQUE CÉSPEDES GUZMÁN



27 de julio de 2023

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND
(AMPB)**

**EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL
Currículum Vitae**

Página 1 de 7

Función Prevista en el Contrato: INGENIERO DIRECTOR DE PROYECTOS

1. Apellidos: Cespedes Guzmán
2. Nombre: Enrique
3. Fecha y Lugar de Nacimiento: 15 de julio del 1975 Nagua RD
4. Nacionalidad: Dominicano
5. Estado Civil: Soltero
- 6.

Idioma	Nivel	Pasivo	Hablado	Escrito
Español	Lengua Materna		x	x
Inglés	Medio	x		

7. Función actual: Ingeniero Civil

8. Otras competencias. (informática, etc):

- Contabilidad: Instituto Provincial (Nagua)
- Cajero: Colegio Salome Ureña
- Sastrería: Escuela Santana Ana
- Ebanistería: Escuela Vocacional
- Liderazgo: VIVE

9. Años de experiencia profesional: 20 Años

10. Cualificaciones Principales:

11. Experiencia específica en países no industrializados: (No)

/UR.10.2012

DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras



12. Experiencia Profesional:

PROYECTOS.

- ❖ Construcción de una verja de 300 metros en boque de 8 donde se selló y se construyó un drenaje de 72 año 1999-2000
- ❖ Construcciones de contenes, aceras y muros en la calle Máximo Gómez en los diversos elevados construidos consecutivos desde la Churchill hasta al Máximo Gomes des del 2000 al 2001 elevado Churchill elevado Lincoln.
- ❖ Construcción de oficina en el km 18 ubicado próximo a modesto en el año del 2000 al 2001.
- ❖ Construcción de naves metálicas, reparación de otras y construcción drenaje en el km 18 dentro del asfalto desde el año 2001 al 2002.
- ❖ Construcción de contenes y aceras en las américas desde el puente Juan Carlos hasta el peaje en el proyecto marginal de las américas desde el año 2003 al 2004.
- ❖ Construcción de canaletas, muros y drenaje desde el puente Juan Carlos hasta el peaje proyecto la marginal de la américa del 2003-2004.

PROYECTO PALMAREJO VILLA LINDA.

- ❖ Construcción de contenes, aceras, badén, puente, cambios de tuberías, rellenos y botes de materiales en diversos lugares del distrito municipal del 2010 al 20117.

PROYECTO VILLA LINDA.

- ❖ Construcción de calle los rieles, contenes, aceras y relleno desde el Ole hasta Palmarejo desde el 2007 al 2008.

PROYECTO AYUNTAMIENTO PANTOJA

SUPERVISOR AGRIMEN. CHINGULO MARTINEZ (829-713-6943)

Programa de asfalto.

- ❖ Construcción en el barrio la redención contenes, aceras, e imprimación próxima al ayuntamiento y aplicación de asfalto años 2007.
- ❖ Construcción calle Juan Bosch, imprimación y aplicación de asfalto del 2012 al 2014.
- ❖ Barrio Villa Morada 2018 al 2019
- ❖ Barrio Villa el palma 2018 al 2019
- ❖ Barrio Progreso I 2018
- ❖ Barrio 23 construcciones de contenes, badenes, imprimación bote de materiales y aplicación de asfalto 2012 al 2014.
- ❖ Barrio la cruz construcción de contenes, aceras, afirmado de calles, bote de materiales, imprimación y aplicación de asfalto del año 2013 al 2015.

guy

/UR.10.2012

DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras



PROYECTO AYUNTAMIENTO VILLA ALTAGRACIA. SUPERVISOR: EULOGIO LORENZO (CEL. 809-949-9024).

- ❖ Construcciones de alcantarillas, aceras, afirmados, y bote de materiales barrio la colina I año 2012.
- ❖ Construcción de puentes aceras, afirmado, en el barrio pajarito arriba en la Gregorio Días del año 2012 al 2015.
- ❖ Construcción de parque infantil barrio duarte en año 2014-2015.
- ❖ Construcciones de aceras, contenes, badenes, en la calle Mauricio Báez, la filantrópica y la María Toledo del barrio la plata en el año 2018.
- ❖ Construcción de aceras, contiene y badenes en la calle la escuela Elizabeth del barrio paraíso I 2018.
- ❖ Acondicionamiento de la calle Francisco Mota, Fidelina Cachón Norte en el barrio mayor de ley en el año 2018.
- ❖ Construcción de la rehabilitación en la calle del barrio isabelita 2018.
- ❖ Construcción de acueducto de mamajaina (joa) en el 2018.
- ❖ Construcción de la calle del sector villa linda acera, contenes, y badenes 2018.
- ❖ Construcción de contenes, aceras, badenes en la calle la maquinaria barrio el silencio 2018.
- ❖ Demolición de contenes en el barrio Peña Gómez en el 2018.
- ❖ Construcción de aceras, contenes, en la calle del barrio 5to centenario parte alta 2018.

PROYECTO PLAN DE ASFALTO VILLA ALTAGRACIA 2019. SUPERVISOR: EULOGIO LORENZO (CEL. 809-949-9024).

- ❖ Calle Chales Girl desde el puente que divide la charle hasta la Emilio Prud'Homme
- ❖ construcción de aceras, badenes, afirmados, botes de materiales e imprimación 2019.
- ❖ Construcción afirmado de botes de materiales inservibles e imprimación en la calle cao-nabo desde la padre Billini hasta la estación 2019.
- ❖ Construcción de afirmado de botes de materiales inservibles e imprimación en la calle Gregorio Díaz desde la Jerónimo Mejía hasta la cao-nabo 2019.
- ❖ Construcción de afirmado de bote de materiales inservibles e imprimación en la calle Charle Girl 2019.
- ❖ Construcción y afirmado de botes y materiales inservibles e imprimación de la calle palosin desde la calle Cheles Girl hasta la estación 2019.
- ❖ Construcción y afirmado de botes y materiales inservibles e imprimación de la calle Gregorio Eves desde la challe Charle Girl hasta el final 2019.
- ❖ Construcción y afirmado de botes y materiales inservibles e imprimación en la respaldo Emilio Prud'Homme hasta la calle Prolongación Independencia 2019.

/UR.10.2012

DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras



- ❖ Construcción y afirmado de botes y materiales inservibles e imprimación de la calle en la calle Mama Tingo desde la calle profesor Melanio Hernández hasta el final 2019.
- ❖ Construcción y afirmado de botes y materiales inservibles e imprimación en la calle Pedro Mir desde la calle Guarionex hasta el final 2019.
- ❖ Construcción y afirmado de botes y materiales inservibles e imprimación de la calle Buenos Aires desde la calle Gastón hasta el final 2019.
- ❖ Construcción de toda la calle del cementerio de Villa Altagracia con afirmado de botes de materiales e imprimación 2019.
- ❖ Construcción y afirmado de botes y materiales inservibles e imprimación de la calle el varón desde la avenida duarte hasta el final 2019.
- ❖ Construcción y afirmado de botes y materiales inservibles e imprimación de la calle respaldo Américo Lugo desde la filantrópica hasta el final 2019.
- ❖ Construcción y afirmado de botes y materiales inservibles e imprimación de la calle en la calle las 10 casitas 2019.
- ❖ Construcción y afirmado de botes y materiales inservibles e imprimación de la calle Bacilo Girl hasta la delicia.
- ❖ Construcción y afirmado de botes y materiales inservibles de la calle los barrio la guásuma colina 4 2019.
- ❖ Demolición y construcción de contenes y badenes en la calle Melanio Hernández y Pedro Mir.

PROYECTO AYUNTAMIENTO LOS ALCARRIZOS. SUPERVISOR: ING. BOLIVAR VALERIO (CEL. 829-292-8405).

- ❖ Construcción de aceras, contenes, badenes en el barrio hato nuevo calle principal hasta villa linda 2007-2009.
- ❖ Construcción de aceras, contenes, rellenos e imprimación en la calle principal de Villa Linda 2007.
- ❖ Construcción de aceras, contenes, badenes e imprimación calle segunda que llega a la ciudad satélite 2008.
- ❖ Relleno de todas las calles de Villa Linda 2008.
- ❖ Construcción multiuso Villa Linda 2018.
- ❖ Relleno barrio el limón todas las calles 2007.
- ❖ Relleno barrio la piña 2007.
- ❖ Contenes y aceras calle la Esperanza 2010-2012.
- ❖ Construcción y aceras en el sector el progreso 2009-2011.
- ❖ Construcción contenes y aceras 2009-2012.
- ❖ Construcción de contenes aceras calle Luperón y otras en el año 2009-2013.
- ❖ Construcción de contenes aceras y badenes en la calle principal del Chabón 2009-2013.

/UR.10.2012

DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras



- ❖ Construcción de drenaje en la calle segunda en la calle principal 2009-2013.
- ❖ Construcción calle primera del Invi contenes, badenes y aceras 2018.
- ❖ Construcción de todas las calles del nazareno contenes, aceras, badenes, rellenos e imprimación 2013-2016.

PLAN DE ASFALTO NAZARENO 2016. ING. BOLIVAR VALERIO (CEL. 829-292-8405).

- ❖ Calle 9
- ❖ Calle 2
- ❖ Calle 4
- ❖ Calle 5
- ❖ Calle Mama Tingo
- ❖ Calle 7
- ❖ Calle Respaldo 5
- ❖ Calle Principal Nazareno
- ❖ Calle 33
- ❖ Calle 31
- ❖ Calle 21
- ❖ Calle 19
- ❖ Calle 20
- ❖ Calle 29
- ❖ Calle 14

Nota:

A todas las calles mencionadas se le hizo contenes, aceras, badenes, botes de materiales inservibles e imprimación 2013-2016.

PLAN DE ASFALTO SAVICA 2011. BOLIVAR VALERIO (CEL. 829-292-8405).

Se construyo contenes aceras badenes rellenos y botes de materiales e imprimacion, las calles son:

- ❖ Calle 10
- ❖ Calle 12
- ❖ Calle 14
- ❖ Calle 16
- ❖ Calle 18
- ❖ Calle 21
- ❖ Calle 25

/UR.10.2012

DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras



- ❖ Calle 19
- ❖ Calle 23
- ❖ Calle Respaldo 10
- ❖ Calle Caridad
- ❖ Calle 7
- ❖ Calle 3
- ❖ Calle 15
- ❖ Calle 13

LOS CERRO PLAN DE ASFALTO 2018-2019. ING. CESAR FRIAS (CEL.829-650-7046).
Construcción de contenes badenes, aceras, instalación de drenaje pluvial y afirmado de botes de materiales inservibles e imprimación.

- ❖ Calle 8
- ❖ Calle J
- ❖ Calle I
- ❖ Calle 28
- ❖ Calle E
- ❖ Calle Respaldo E
- ❖ Calle D
- ❖ Calle 1ra
- ❖ Calle 2da
- ❖ Calle 3ra
- ❖ Calle La Duarte
- ❖ Calle 4
- ❖ Calle 5
- ❖ Calle la B
- ❖ Calle B
- ❖ Calle C

BARRIO TAMARINDO PLAN DE ASFALTO. BOLIVAR VALERIO (CEL. 829-292-8405)
construcción de contenes aceras badenes bote de materiales inservibles e imprimación en las siguientes calles.

- ❖ Calle La cereza
- ❖ Calle La Toronja
- ❖ Calle La Naranja

/UR.10.2012

DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras



- ❖ Calle La principal
- ❖ Calle La 2da
- ❖ Calle La 3ra
- ❖ Calle El Limón

CALLE LOS COQUITOS.

Construcción badenes, rellenos y contenes.

- ❖ Calle 1ra
- ❖ Calle 2da

CALLE LOS PRADOS.

- ❖ Construcción de contenes badenes y confirmado 2014.
- ❖ Construcción de parqueo para vehículos al lado de la ferretería doña julia 2014.
- ❖ Construcción de Play en el hoyo de sávica en proceso de inicio 2019.

a. Referencias:

- ❖ Ing. Ennis Sánchez Vidal (Superv. De Asfalto de Obras Públicas, Gran Sto. Dgo.)
829-754-6542
- ❖ Sr. Cristian Encarnación (alcalde) 849-656-1952
- ❖ Sr. Danilo Rafael Santos (Ex_alcalde) 809-309-8704
- ❖ Dr. Edwin Ferreras (Ex_alcalde) 809-877-5452
- ❖ Ing. Joselin Valdez Mora (alcalde) 829-207-3376

Firma:
Sello





**COLEGIO DOMINICANO
DE INGENIEROS, ARQUITECTOS
Y AGRIMENSORES (CODIA)**



APELLIDOS:
Céspedes Guzmán

NOMBRES:
Enrique

PROFESION:
Ing. Civil

EXEQUATUR 194

D/F: 04/05/

CEDULA: 071-0031339-9

COLEGIATURA: 17062

Firma colegiado

Firma Presidente

Eng

ENRIQUE CESPEDES GUZMAN

C/1ra, No.5, La Yuca, Los Girasoles, Santo Domingo.
Telf. 849-916-8799, 809-714-9195, CED. 071-0031339-9

CARTA DE INTENCION Y DISPONIBILIDAD

27 de julio de 2023

Señores:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND (AMPB)

Por medio de la presente Yo, **Ing. Enrique Céspedes Guzmán**, Cedula de identidad y electoral **No. 071-0031339-9**, me dirijo para dar informe de nuestra intención en participar en el proceso de comparación de precios para la **"Contratación De La Construcción de Obras del Presupuesto Administrativo 2023 Del Ayuntamiento Del Municipio De Pedro Brand, Ítem. No. 5. 2da Etapa de suministro y Compactado de Tosca Duarte Vieja, Pedro Brand, Ítem 10. Instalación de Tuberías La Esperanza Eduardo Brito I y II, La Polonia y Ítem 11. Suministro y compactación de Tosca Los Corozos, El Catalán y La Mina. (Referencia: AMPB-CCC-CP-2023-0002).** A la vez le comunicamos que estamos en la disponibilidad de iniciar los trabajos una vez finalizada la firma del contrato.

Sin otro particular se despide.



Ing. Enrique Céspedes Guzmán
Representante Técnico

**CODIA****Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores**CALLE PADRE BILLINI No. 58
CIUDAD COLONIALCABLE: CODIA APARTADO 1514
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
E-mail: presidenciacodiacentral@gmail.com • www.codia.org.do
RNC: 401-00941-2

Tel: 829-378-0038

"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CODIA"**"CERTIFICACIÓN"****"A QUIEN PUEDA INTERESAR"**

Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a)
ENRIQUE CESPEDES GUZMAN ***** portador(a) de la Cédula de
Identidad Electoral No. 07100313399, es miembro del Colegio Dominicano
de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con la
Colegiatura No. 17062, Exequatur No. 194, de fecha 04/05/2000
de profesión INGENIERO CIVIL.

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 25 días
del mes de Julio del año 2023.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

AGR. JUAN A. VILLAR G.

Colegiatura 7844

Secretario General CODIA

ING. CIV. CRISTIAN SALVADOR ROJAS MORA

Colegiatura 11295

Presidente CODIA





27 de julio de 2023

Página 1 de 2

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
PEDRO BRAND (AMPB)
ESTRUCTURA PARA BRINDAR SOPORTE TÉCNICO AL EQUIPO OFERTADO**

Nombre del Oferente: ENRIQUE CESPEDES GUZMAN

A. Personal de soporte técnico.

Nombre	Cargo o labor que desempeña	Estudios realizados y profesión	Experiencia en su labor actual
Enrique Céspedes guzman	Ingeniero Residente	Ingeniero Civil	23 años
Juan Vásquez Rojas	Maestro de obra	Maestro	20 años
Alexander Martínez	Contador	Contabilidad	Mas de 20 años
Juan Vásquez Rojas	Maestro general	Maestro general	10 años
Yon Ventura	mecánico	mecánico	10 años
Fernando Cabrera	Chofer	Chofer	4 años

B. Facilidades del taller.

Instalaciones físicas:

Equipos de medición y herramientas:

- 1 Cinta Métrica.
 2. Odómetro.
- Herramientas:
2. Ligadora de Concreto (Trompo)
 2. Maquito Compactador
 3. Carretillas
 4. Palas
 5. Picos
 6. Martillos
 7. Cortadora de Mano

E.C.G.

Existencias de partes y repuestos para los modelos del equipo ofertado:

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia 1 – Agregar Destino

--

Transporte:

Otras facilidades:

Tenemos la facilidad de comprar cualquier equipo y/o herramienta necesarios para la realización de la obra.

Por este medio autorizo a la (AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LOS ALCARRIZOS) para hacer cualquier visita o investigación a efectos de constatar la veracidad de lo anteriormente expuesto.

Nombre Ing. Enrique Céspedes Guzmán en calidad de Gerente debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de (Ing. Enrique Céspedes Guzmán.).

Firma autorizada y sello - Fecha



/UR.010-2012

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND (AMPB)

27 de julio de 2023

Página 1 de 1

EQUIPOS DEL OFERENTE

Señores:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND (AMPB)

Cortésmente detallamos a continuación el equipo afectado a la ejecución de la obra Construcción de Obras del Presupuesto Administrativo 2023 Del Ayuntamiento Del Municipio De Pedro Brand, Ítem. No. 5. 2da Etapa de suministro y Compactado de Tosca Duarte Vieja, Pedro Brand, Ítem 10. Instalación de Tuberías La Esperanza Eduardo Brito I y II, La Polonia y Ítem 11. Suministro y compactación de Tosca Los Corozos, El Catalán y La Mina. (Referencia: AMPB-CCC-CP-2023-0002). de esa Institución.

	Descripción	Potencia/ Capacidad	No. de unidades	Antigüedad (años)	Propiedad (P) o Alquiler (A) y porcentaje de la propiedad	Origen (país)	Valor actual en Pesos Dominicanos
a)	Equipos de construcción						
	Ligadora mecánica (trompo)	2 fda	4	1.5	P	RD	160,000.00
b)	Vehículos y Camiones						
	Retropala		1		A	uuss	
	Rodillo De 10 Toneladas		1		A	uuss	
	Gredar		1		A	uuss	
	Camiones Volteo		1		A	uuss	
	Compresor		1		A		
	Compactador Manual (Maquito)		2	1	P	RD	170,356.32
c)	Otros Equipos						
	Luminarias		2		A		

Firma

 DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
 Original 1 – Expediente de Compras
 Copia 1 – Agregar Destino


/UR.10.2012



Compresores y Excavadoras, S. R. L.

CARTA DE COMPROMISO DE ALQUILER DE EQUIPOS

SANTO DOMINGO REP. DOM.

24 JULIO 2023

Yo, FREDDY ENRIQUE PEÑA Y/O COMPEXC SRL, en calidad de Gerente General con RNC.
130366187 y cedula 001-0150867-9, propietario de los siguientes equipos:

EXCAVADORA DOOSAN 225

MARCA

SERIE

RODILLO CAT INGESOR RANG

MARCA

SERIE

RETRO PALA CAT 420D

MARCA

SERIE

GREDAR D6

MARCA SERIE

CAMION VOLTEO DE 18 A 20 MTS


MARCA

PLACA

ME COMPROMETO

Con el alquiler de los equipos anteriormente mencionados desde el inicio hasta el fin de la obra sin límite de tiempo, al SR. ENRIQUE CESPEDES GUZMAN, cedula No. 071-0031339-9, para la ejecución del Proyecto a ejecutar, en el sector los Corozo, segunda etapa de la duarte vieja, y el sector las mercedes.

Ing. Freddy Peña



C/ Luis F. Thomen Esq. Carmen Mendoza de C.
Tel.: 809-412-4102
E-mails: ing_fp@hotmail.com
Compexc@gmail.com

#-18

REPUBLICA DOMINICANA
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

No. 1947399

CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE VEHICULOS DE MOTOR

1. Datos del Vehículo

No. de Registro y Placa	Chasis	Estatus del Vehículo	Tipo de Emisión			
U008839	DHKHEMX0H60002233	ACTIVO	CORRIENTE			
Tipo de Vehículo		Marca	Modelo	Año de Fabricación		
MONTACARGA		DAEWOO	S225LC-V	2006		
Color	Motor o No. de Serie	Pasajeros	Fuerza Motriz (HP/cc)	Cap. Carga (Ton.)	Cilindros	No. Puertas
MAMEY	DB58TIS-500750EB	1	5785	1		6 0

2. Datos del Propietario

Nombres/Razón Social	Cédula/Pasaporte/RNC
MAPEK S A	101109351
Dirección	No. de Registro y Placa Anterior
MUSTAFA KEMAL ATACTUK 2 105-0 SN	

NIMWEBAPP 09:26 AM REGDEVEHICU
066501646942

No. 2885618

REPÚBLICA DOMINICANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE VEHÍCULOS DE MOTOR

1. Datos del Vehículo

No. de Registro y Placa	Chasis	Estatus del Vehículo	Tipo de Emisión			
U008818	DHKHEMX0P70003858	ACTIVO	CAMBIO AÑO DE FABRICACIÓN			
Tipo de Vehículo	Marca	Modelo	Año de Fabricación			
MAQUINA PESADA	DOOSAN	S225LC-V	2008			
Color	Motor o No. de Serie	Pasajeros	Fuerza Motriz (HP/cc)	Cap. Carga (Ton.)	Cilindros	No. Puertas
MAMEY	DB58TIS-712024EB	5	5785		6	0

2. Datos del Propietario

Nombres/Razón Social	Cédula/Pasaporte/RNC
COMPEXC COMPRESORES Y EXCAVADORAS S.A.	1-30-36618-7
Dirección	No. de Registro y Placa Anterior
PABLO CASSAL 18 RES. KEILLY PIANTINI DISTRITO NACIONAL	

DVENTURA 12:06 PM DGIADFW00019
086501047982

Funcionario Autorizado

No. 2490545

REPÚBLICA DOMINICANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE VEHÍCULOS DE MOTOR

1. Datos del Vehículo

No. de Registro y Placa	Chasis	Estatus del Vehículo	Tipo de Emisión			
UD02036	DHKHEMX0S70003101	ACTIVO	CORRIENTE			
Tipo de Vehículo	Marca	Modelo	Año de Fabricación			
MAQUINA PESADA	DAEWOO	S225LC-V	2007			
Color	Motor o No. de Serie	Pasajeros	Fuerza Motriz (HP/cc)	Cap. Carga (Ton.)	Cilindros	No. Puertas
MAMEY	DB53TIS-700525EB	5	5785	1	6	0

2. Datos del Propietario

Nombres/Razón Social	Cédula/Pasaporte/RNC
COMPEXC COMPRESORES Y EXCAVADORAS S.A.	130360187
Dirección	No. de Registro y Placa Anterior
EDMUNDO MARTINEZ 53 LA FERIA	

NMVEDAPP 04:03 PM DGIIMPERW000
078501786372

Funcionario Autorizado

No. 7078253

REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE VEHÍCULOS DE MOTOR

1. Datos del Vehículo

No. de Registro y Placa	Chasis	Estatus del Vehículo	Tipo de Emisión			
L060352	JN1CJUD22Z0726278	ACTIVO	TRASPASO DE VEHICULO			
Tipo de Vehículo	Marca	Modelo	Año de Fabricación			
CARGA	NISSAN	CABSTAR	2001			
Color	Motor o No. de Serie	Pasajeros	Fuerza Motriz (HP/cc)	Cap. Carga (Ton.)	Cilindros	No. Puertas
BLANCO	QD32 12852	5	3200	1	4	4

2. Datos del Propietario

Nombres/Razón Social	Cédula/Pasaporte/RNC
COMPEXC COMPRESORES Y EXCAVADORAS S.A.	1-30-36618-7
Dirección	No. de Registro y Placa Anterior
CARMEN MENDOZA 30 NUEVO HORIZONTE QUEQUEYA DISTRITO NACIONAL	LFJ820

ANRODRIGUE 01:41 PM WK30CBLINTRA03
036515215067

Funcionario Autorizado

Scanned with CamScanner

Escaneado con CamScanner

E.C.A

No. 5375059

Fecha de Expedición		
20	06	2014

1. Datos del Vehículo

CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE VEHICULOS DE MOTOR

No. de Registro y Placa	Chasis	Status del Vehículo	Tipo de Emisión			
L327547	9BSR6X4A043553544	ACTIVO	TRASPASO DE VEHICULO			
Tipo de Vehículo	Marca	Modelo	Año de Fabricación			
CARGA	SCANIA	R124	2004			
Color	Motor o No. de Serie	Pasajeros	Fuerza Motriz(HP/cc)	Cap. Carga (Ton.)	Cilindros	No. Puertas
BLANCO	8033807	2	3000	0	6	2

2. Datos del Propietario

Nombres/Razón Social	Cédula/Pasaporte/RNC
COMPEXC COMPRESORES Y EXCAVADORAS SA	1-30-36618-7
Dirección	No. de Registro y Placa Anterior
CARMEN MENDOZA 30 NUEVO HORIZONTE QUISQUEYA DISTRITO NACIONAL	EX08605

YPADUA 03:28 PM DGIIDVEHW031
046500433702



No. 5375057

Fecha de Expedición		
20	06	2014

1. Datos del Vehículo

CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE VEHICULOS DE MOTOR

No. de Registro y Placa	Chasis	Status del Vehículo	Tipo de Emisión			
F004374	1S92S2839YM006629	ACTIVO	TRASPASO DE VEHICULO			
Tipo de Vehículo	Marca	Modelo	Año de Fabricación			
REMOLQUE	J & J	TS-1	2000			
Color	Motor o No. de Serie	Pasajeros	Fuerza Motriz(HP/cc)	Cap. Carga (Ton.)	Cilindros	No. Puertas
MAMEY		0	0	0	3	0

2. Datos del Propietario

Nombres/Razón Social	Cédula/Pasaporte/RNC
COMPEXC COMPRESORES Y EXCAVADORAS SA	1-30-36618-7
Dirección	No. de Registro y Placa Anterior
CARMEN MENDOZA 30 NUEVO HORIZONTE QUISQUEYA DISTRITO NACIONAL	EX06073

YPADUA 03:17 PM DGIIDVEHW031
036519804467



E.C.G

No. 1437827 7-7

REPÚBLICA DOMINICANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE VEHICULOS DE MOTOR

1. Datos del Vehículo

No. de Registro y Placa	Chasis	Estatus del Vehículo	Tipo de Emisión	
11007961	4ZN23938	CORRIENTE	NUEVA	
Tipo de Vehículo	Marca	Modelo	Año de Fabricación	
MAQUINA PESADA	CATERPILLAR	416C	2001	
Color	Motor o No. de Serie	Pasajeros	Fuerza Motriz (HP/cc)	Cap. Carga (Ton.)
AMARILLO	H23938	1	0	7

2. Datos del Propietario

Nombres/Razón Social	Cédula/Pasaporte/RNC
ROSMERY CONTRERAS DELGADO	00115968224
Dirección	No. de Registro y Placa Anterior
CALLE LUIS ALBERT, ESQ. MUSTAFÁ KEMEL, ZONA INDUSTRIAL DE PUERTO RICO, PROV. SANTIAGO	



UO-827-71103020051044250

1030 2005 1044 25 0

Funcionario Autorizado

E.C.G.

Scanned with CamScanner

 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA		IMPORTACION: RECEPCION-ENTREGA PUERTO HAINA ORIENTAL		FORM. OP - 05		28/7/2014 AP		3282	
				C/E No. 921		JUNIA		SELLO	
EMBARCADOR		CONSIGNATARIO		BUQUE		ATRACADERO			
		FREDY E PERA		SD TADEA		ESCOTILLA		TURNO	
				REGISTRO 0902		FECHA A TRACQUE		FECHA INICIO DESCARGA	
AGENCIA		PUERTO DE CARGA		PUERTO DESCARGA		CARGA ALMACENADA EN			
H.D.		HAINA O.							
MANIFESTADO	MARCAS Y NUMEROS	CLASE BULTO	CONTENIDO	TOT. RECIBIDO	FALTA	SOBRA	AVERIADO	PESO BRUTO	MEDIDA
1	CAT 420DL3LN01899		2001CATAPILLA A 420D 3T 4X4		1253			3,401.58 kg	
OBSERVACIONES:									
						ADUANA			
FECHA	FECHA	AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA		FECHA					
NOMBRE	NOMBRE	TARJADOR		NOMBRE					
TARJADOR AGENCIA	TARJADOR AGENCIA	DIVISION CONTROL TRAFICO							
									

EL 4



ECG

RNC: 132016149
miércoles, 26 de julio de 2023

CERTIFICACION

SEÑORES:

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO BRAND

A: unidad de compras y contrataciones

Referencia: AMPB-CCC-CP-2023-0002

"CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND."

ASUNTO:

DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS

DISTINGUIDOS SEÑORES:

Por medio de la presente certificamos que los equipos presentados para el alquiler, por el ing. ENRIQUE CESPEDES GUSMAN para la ejecución de dicho proyecto, están disponible para ser recogidos de inmediato por el periodo que sea pertinente en caso de ser contratados.

Listado de equipos:

- 1- Compactadores manuales (maquito)
- 2- Lijadora de concreto
- 3- Rodillo
- 4- Compresor

Quedo a su disposición

Licdo. Wilkins Valenzuela

Director general



Entrada de Los Alcarizos Calle San Antonio No. 35, Santo Domingo
Tel.: (809) 285-3283 Email: wilvalenz@hotmail.com

San Cristóbal, R. D.
27 de julio de 2023

Señores : Ayuntamiento Municipal de Pedro Brand
Santo Domingo Oeste

Referencia : Suministro y Compactación de Tosca Los Corozo, El Catalán y La Mina, Pedro Brand.
3era Etapa Suministro y Compactado de Tosca, Duarte Vieja, Pedro Brand.

Asunto : Carta Compromiso Disponibilidad de Equipos

Distinguidos Señores:


Por medio de la presente, les certificamos que contamos con los equipos que se detallan a continuación, los cuales se encuentran disponibles para ser suministrados en condición de renta para. **ING. ENRIQUE CÉSPEDES. GUZMÁN.**

No.	Descripción de Equipos	Cant.	Modelo/ Marca	Ubicación
1	Motoniveladora	1	CHAMPION	Campamento
2	Retroexcavadora	1	JCB	Campamento
3	Ligadora de contrero	4	Arke Industry	Campamento
4	Luminarias Portátil de 20'	2	Wacker Neuson	Campamento
5	Compresor Neumático 2 Pistolas	2	Sulliard	Campamento
6	Compactador Manual Vibratorio (Maquito)	2	Mikasa	Campamento

Sin más que agregar por el momento y esperando colaborar con ustedes y su empresa en el logro de sus objetivos, sin más que agregar, quedamos a su disposición para cualquier consulta.

Cordialmente,


ING. GAMALIEL VALDEZ
Ced. : 002-0019171-6



No. 1597151

REPUBLICA DOMINICANA
SECRETARÍA DE ESTADO DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES INTERNOS
CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE VEHICULOS DE MOTOR

1. Datos del Vehículo		Fecha de Expedición	
No. de Registro y Placa	Chasis	11 04 2008	
U000882	X02B37BXX	ACTIVO	
Tipo de Vehículo		Tipo de Emisión	
MAQUINA PESADA		CAMBIO AÑO DE FABRICAC	
Color	Motor o No. de Serie	Modelo	Año de Fabr
AMARILLO	937BXX	720A	2002
Pasajeros		Fuerza Motriz (HP/cc)	Cap. Carga (Ton.)
1		1	0
Cilindros		No.	
4		2	
2. Datos del Propietario			
Nombres/Razón Social		Cédula/Passaporte/R.N.C.	
GAMALIEL VALDEZ CEPEDA		002-0018171-8	
Dirección		No. de Registro y Placa Ant	
GASTON F. DELIGNE 21 VILLA VALDEZ SAN CRISTOBAL		UJ0535	
RURAMIREZV 02:02 PM DGIAPPSV34 038514448860			
Funcionario Autorizado			

No. 3078358

REPUBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES INTERNOS
CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE VEHICULOS DE MOTOR

1. Datos del Vehículo		Fecha de Expedición	
No. de Registro y Placa	Chasis	10 12 2008	
U002511	SLP214FC1E0488908	ACTIVO	
Tipo de Vehículo		Tipo de Emisión	
MAQUINA PESADA		TRASPASO DE VEHICULO	
Color	Motor o No. de Serie	Modelo	Año de Fabr
AMARILLO	860082	214E 4T 4WD	2002
Pasajeros		Fuerza Motriz (HP/cc)	Cap. Carga (Ton.)
1		2500	0
Cilindros		No.	
4			
2. Datos del Propietario			
Nombres/Razón Social		Cédula/Passaporte/R.N.C.	
GAMALIEL VALDEZ CEPEDA		002-0018171-8	
Dirección		No. de Registro y Placa Ant	
GASTON F. DELIGNE 21 21 VILLA VALDEZ SAN CRISTOBAL		UB2318	
RURAMIREZV 05:24 PM DGIICO08V00018 036521257183			
Funcionario Autorizado			

E.C.H

Santo Domingo
27 de julio del 2023

Señores : Ayuntamiento Municipal de Pedro Brand
Santo Domingo Oeste

Referencia : Suministro y Compactación de Tosca Los Corozo, El
Catalán y La Mina, Pedro Brand.
3era Etapa Suministro y Compactado de Tosca, Duarte
Vieja, Pedro Brand.


Asunto : Carta de compromiso de alquiler de equipos.

Distinguidos:


Luego de un cordial saludo, hacemos constar mediante la presente, que tenemos la disponibilidad de rodillo de tierra que colocamos 100% a disposición del **Ing. Enrique Céspedes Guzmán**.

Como constancia de lo anterior, les confirmamos nuestro compromiso de brindar el servicio de alquiler de equipos, adjuntando la relación de las unidades que se encuentran disponibles y reservadas para la ejecución de esos trabajos:

Descripción	UD	Año
Camión volteo marca SCANIA	1	2009
Camión volteo marca SCANIA	1	2011
Camión volteo marca SCANIA	1	2010
Camión volteo marca SCANIA	1	2008
Rodillo marca DYNAPAC	1	1997

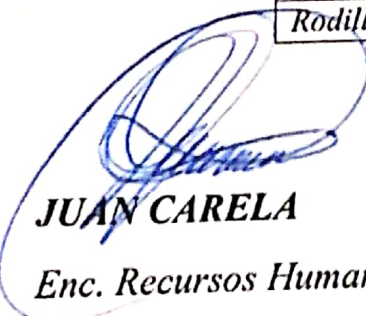
JUAN CARELA

Enc. Recursos Humanos



E.C.G.

No. 3684002

REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE VEHÍCULOS DE MOTOR

Fecha de Expedición

11 08 2010

Datos del Vehículo

de Registro y Placa	Chasis	Status del Vehículo	Tipo de Emisión			
S006515	9BSP8X40083828017	ACTIVO	ENDOSO			
o de Vehículo	Marca	Modelo	Año de Fabricaci			
VOLTEO	SCANIA	P420 B6X4	2009			
lor	Motor o No. de Serie	Pasajeros	Fuerza Motriz (HP/co)	Cap. Carga (Ton.)	Cilindros	No. Puér
AMARILLO	8106188	2	420	28	6	2

Datos del Propietario

ombres/Razón Social	Cédula/Pasaporte/RNC
CONSTRUCTORA JM S A	1-01-73527-9
rección	No. de Registro y Placa Anterior
ARISTIDES GARCIA GOMEZ 15 0 LOS PRADOS DEL MONTE	

MMERCEDESC 1135 AM DGIHADHEW008
106500527847

Funcionario Autorizado



No. 4001564

REPUBLICA DOMINICANA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE VEHICULOS DE MOTOR

Fecha de Expedición

07 04 2011

1. Datos del Vehículo

No. de Registro y Placa	Chasis	Status del Vehículo	Tipo de Emisión	
L293383	9BSP6X40083622071	ACTIVO	ENDOSO	
Tipo de Vehículo		Marca	Modelo	Año de Fabricación
CARGA		SCANIA	P420 B6X4	2008
Color	Motor o No. de Serie	Pasajeros	Puerta Motriz (HP/cc)	Cap. Carga (Ton.)
AMARILLO	8103209	2	420	28
				Cilindros
				6
				No. Puertas
				2

2. Datos del Propietario

Nombres/Razón Social	Cédula/Pasaporte/RNC
CONSTRUCTORA J M S A	1-01-73527-9
Dirección	No. de Registro y Placa Anterior
ARISTIDES GARCIA GOMEZ 15 O LOS	
PADAMES 11:59 AM WK30CBLINTRA03	
116500215720	



E.C.Y

No. 4001548

REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE VEHÍCULOS DE MOTOR

Fecha de Expedición

07

04

2011

Datos del Vehículo

Pro y Placa	Chasis	Status del Vehículo	Tipo de Emisión			
29-060	9BSP6X40083622065	ACTIVO	ENDOSO			
de Vehículo	Marca	Modelo	Año de Fabricación			
ARGA	SCANIA	P 420 B6X4	2008			
de Vehículo	Motor o No. de Serie	Pasajeros	Fuerza Motriz (HP/cc)	Cap. Carga (Ton.)	Cilindros	No. Puerta
MARILLO	8103205	2	420	28	6	2

Datos del Propietario

Nombres/Razón Social

CONSTRUCTORA J M B A

Domicilio

ARISTIDES GARCIA GOMEZ 15 0

PADAMES 09:12 AM W30CBLINTRA03

116500189192

Cédula/Pasaporte/RNC

1-01-73527-9

No. de Registro y Placa Anterior



E.C.G.

No. 3626553

Fecha de Expedición

21 04 2010

REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE VEHÍCULOS DE MOTOR

1. Datos del Vehículo

No. de Registro y Placa	Chasis	Status del Vehículo	Tipo de Emisión	
L281778	88SP6X40003628007	ACTIVO	ENDOSO	
tipo de Vehículo	Marca	Modelo	Año de Fabricac	
CARGA	SCANIA	P 420 B0X4	2009	
Color	Motor o No. de Serie	Pasajeros	Puerta Motriz (HP/cc)	Cap. Carga (Ton.)
AMARILLO	8186223	2	3000	0
			Cilindros	No. Puc
			3	2

2. Datos del Propietario

Nombre/Razón Social	Cédula/Pasaporte /RNC
CONSTRUCTORA JM S A	01-73527-0
Dirección	No. de Registro y Placa Anterior
A. DES GARCIA GOMEZ 16 0 LOS PRADOS	

NSANCHEZ 10:16 AM DGII/ALCEW057
100500345442

Funcionario Autorizado

E.L.G.



DECLARACION UNICA ADUANERA (DUA)



110119791

IDENTIFICACION

A) DECLARACION	B) IMPORTADOR / EXPORTADOR	C) AGENTE DE ADUANAS
1. DECLARACION <u>1030-10-00020875</u>	1. NOMBRE O RAZON SOCIAL <u>CONSTRUCTORA J M S A</u>	1. NOMBRE <u>GLADYS JOSEFINA MOJICA LARA DE CEDANO</u>
2. FECHA <u>13/05/2010</u>	2. DIRECCION <u>C/ ARISTIDES GARCIA GOMEZ.</u>	2. CODIGO <u>466-95</u>
3. TIPO DE DECLARACION <u>IMPORTACION</u>	3. TELEFONO <u>809 544-7399</u>	3. CEDULA <u>00108330242</u>
4. PUERTO DE SALIDA/ENTRADA CODIGO: <u>1030</u> <u>HAJIA ORIENTAL</u>	4. E-MAIL	II. REGIMEN ADUANERO Y PREFERENCIAS ARANCELARIAS 1. REGIMEN ADUANERO CODIGO: _____ <u>DESPACHO A CONSUMO</u> 2. PREFERENCIA ARANCELARIA
5. PAIS PROCEDENCIA/DESTINO CODIGO: <u>USA</u> <u>ESTADOS UNIDOS</u>	5. FAX <u>809 227-9182</u>	
6. DESTINATARIO	6. RNC. <u>101735279</u>	
7. No. DOC. EMBARQUE <u>MXRSMZDR90536</u>	7. CED. O PASAPORTE	
9. MEDIO DE TRANSPORTE: a) Nombre de la Empresa <u>MARINE EXPRESS DOMINICANA S A</u> b) Numero de Viaje/Vuelo <u>008</u> c) Nacionalidad <u>ESTADOS UNIDOS</u>	III. SOLO PARA LOS REGIMENES DE ZONA FRANCA Y DE ADMISION TEMPORAL 1. DATOS RELATIVOS A LA EXPORTACION: a) MATERIA PRIMA IMPORTADA UTILIZADAS (CIF) VALOR US\$ <u>50.00</u> b) MATERIA PRIMA LOCAL VALOR US\$ <u>50.00</u> c) SUELDOS Y SALARIOS VALOR US\$ <u>50.00</u> d) CONTRATACION DE SERVICIOS VALOR US\$ <u>50.00</u> e) OTROS VALOR US\$ <u>50.00</u>	
10. CANAL <u>Verde</u>		

X. DOCUMENTOS PRESENTADOS

FECHA	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE	TELEFONO	EMAIL
5-4-10	FACTURA COMERCIAL	HECTOR RIVERA RAMOS	787 314-9824	
MXRSMZDR90536	CONOCIMIENTO DE EMBARQUE /BL			

IV. DECLARACION DE LA MERCANCIA

NO.	1. CODIGO ARANCELARIO	2. DETALLE	3. PRODUCTO ORGANICO	4. PAIS ORIGEN	5. CANT.	6. UNIDAD	7. PESO	8. VALOR FOB (US\$)	9. PRECIO AL POR MENOR (RD\$)
1	8429.40.00	RODILLO MARCA DYNAPAC MODELO CC501 AO 1997 C/AMARILLO SN: 60910698	NO	USA	1.00	Unidad	18,144.00	5,000.00	0.0000

VII. DATOS DE CHASIS

DETALLE	NO.	NUMERO DE CHASIS	NUMERO DE MOTOR	COLOR	CAPACIDAD CUBICA (CC)
1	1	60910698		AMARILLO	

VII. VALOR EN US\$

1. CONCEPTO	2. MONTO	1. KILOGRAMO BRUTO	2. KILOGRAMO NETO
a) TOTAL FOB	\$5,000.00		18144.00
b) SEGURO	\$100.00		18144.00
c) FLETE	\$4,700.00		
d) OTROS	\$0.00		
e) TOTAL CIF	\$9,800.00		

VIII. PESO DE LA MERCANCIA

IX. AUTOLIQUIDACION (TOTAL A PAGAR)

1. TASA OFICIAL DEL DIA	RD\$36.58
2. TOTAL RD\$	

PARA USO OFICIAL (NO ESCRIBIR)

 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
(NOMBRE-FIRMA-SELLO)

 VERIFICADO CONFORME OFICIAL DE
ADUANAS (NOMBRE-FIRMA-SELLO)

ADMINISTRADOR DE ADUANA (FIRMA-SELLO)



DECLARACION UNICA ADUANERA (DUA)



110119791

X. OBSERVACIONES

8-5-10 PARQUEO 1 EQUIPOS ESPECIALES ANEXO CARTA DESGLOSE BL Y DECLARACION JURADA EMBARCADOR



E. C. B.

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
(NOMBRE-FIRMA-SELLO)

VERIFICADO CONFORME OFICIAL DE
ADUANAS (NOMBRE-FIRMA-SELLO)

ADMINISTRADOR DE ADUANA (FIRMA-SELLO)

San Cristóbal, República Dominicana
27 de julio de 2023

Señores:

Ayuntamiento del Municipio de Pedro Brand
Sus manos.-

Referencia:

- Suministro y Compactación de Tosca Los Corozo, El Catalán y La Mina, Pedro Brand.
- 3era Etapa Suministro y Compactado de Tosca, Duarte Vieja, Pedro Brand.

Asunto:

Carta Compromiso Disponibilidad de Equipos


Distinguidos Señores:

Por medio de la presente, les certificamos que contamos con los siguientes equipos, los cuales se encuentran disponibles y serán suministrados en condición de renta al **ING. ENRIQUE CÉSPEDES GUZMÁN**.

No.	Descripción de Equipos	Cant.	Modelo/ Marca	Ubicación
1	Camión Volteo	2	MITSUBISHI	Campamento

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, sin más que agregar por el momento, quedamos a su disposición para cualquier consulta.

Atentamente,


Sr. Frank Manace Guerrero Abrahan
Propietario

Ced.: 027-0002197-1
Cel.: (809)757-4460



No. 4440679

REPUBLICA DOMINICANA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE VEHICULOS DE MOTOR

Fecha de Expedición		12	07	2012
---------------------	--	----	----	------

Datos del Vehículo		Status del Vehículo		Tipo de Emisión	
No. de Registro y Placa	Chasis	VEHICULO TIENE OPOSICION		PRENDA SIN DESAPODERAMIENTO	
S013424	FV515JA02722				
Color de Vehículo	Marca	Modelo	Año de Fabricación		
VOLTEO	MITSUBISHI	FV515JDCL	2008		
or	Motor o No. de Serie	Pasajeros	Fuerza Motriz (HP/cc)	Cap. Carga (Ton.)	Cilindros No. Puertas
BLANCO	8DC9456660	3	16031	28	8 2

Datos del Propietario		Cédula/Pasaporte /RNC
Nombres/Razón Social		027-0002197-1
FRANK MANACE GUERRERO ABRAHAM		
Dirección		No. de Registro y Placa Anterior
EBANO 23 23 MADRE VIEJA SUR SAN CRISTOBAL		

ECASILLA 04:06 PM WK30CBLINTRA03
076501127743

No. 4440676

REPUBLICA DOMINICANA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE VEHICULOS DE MOTOR

Fecha de Expedición		12	07	2012
---------------------	--	----	----	------

I. Datos del Vehículo		Status del Vehículo		Tipo de Emisión	
No. de Registro y Placa	Chasis	VEHICULO TIENE OPOSICION		PRENDA SIN DESAPODERAMIENTO	
S012227	FV515JA01947				
Color de Vehículo	Marca	Modelo	Año de Fabricación		
VOLTEO	MITSUBISHI	FV515JDCL	2007		
Color	Motor o No. de Serie	Pasajeros	Fuerza Motriz (HP/cc)	Cap. Carga (Ton.)	Cilindros No. Puertas
BLANCO	8DC9455150	3	16031	9	8 2

Datos del Propietario		Cédula/Pasaporte /RNC
Nombres/Razón Social		027-0002197-1
FRANK MANACE GUERRERO ABRAHAM		
Dirección		No. de Registro y Placa Anterior
EBANO 23 23 MADRE VIEJA SUR SAN CRISTOBAL		

ECASILLA 04:02 PM WK30CBLINTRA03
066501417763

ECG



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND (AMPB)

27 de julio de 2023

PERSONAL DE PLANTILLA DEL OFERENTE


Página 1 de 1

Señores

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PEDRO BRAND (AMPB)

Cortésmente, detallamos a continuación el personal de plantilla afectado a la ejecución de la obra Construcción de Obras del Presupuesto Administrativo 2023 Del Ayuntamiento del Municipio de Pedro Brand.

i-	Total de personal	
a.	Personal de dirección y gestión	3
b.	Personal administrativo	2
c.	Personal técnico	
	- Ingenieros	3
	- Geómetras	
	- Capataces	3
	- Mecánicos	
	- Técnicos	
	- Operadores de maquinaria	2
	- Conductores	2
	- Otros especialistas	
	- Obreros y manos de obra no cualificada	16
	Total	31
ii-	Personal operativo de obra que se destinará al contrato (si procede)	
a.	Gestión de obra	2
b.	Personal administrativo	2
c.	Personal técnico	
	- Ingenieros	3
	- Geómetras	
	- Capataces	3
	- Mecánicos	
	- Técnicos	2
	- Operadores de maquinaria	
	- Conductores	2
	- Otros especialistas	
	- Obreros y manos de obra no cualificada	16
	Total	30



Ing. Enrique Céspedes

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino

